

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL AJUSTADO (PMIA)

Suscrito con CONEAUPA – Vigencia 2012-2016

- INFORME DE CUMPLIMIENTO -

Del 1 de junio 2015 al 31 de mayo de 2016

Junio de 2016

Autoridades Universitarias

Dr. Oscar M. Ramírez R.
Rector

Ing. Rubén D. Espitia P.
Vicerrector Académico

Dra. Casilda Saavedra de Madrid
Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión

Ing. Esmeralda Hernández P.
Vicerrectora Administrativa

Ing. Luis A. Barahona G.
Secretario General

Licdo. Jeremías Herrera P.
Coordinador General de los Centros Regionales

EQUIPO RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO

Dirección General de Planificación Universitaria

Ing. Angelino Harris – Director

Lcda. Luzmelía Bernal – Sub-directora

Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación

Lcda. Brenda Pinzón - Jefa del Departamento de Evaluación y Calidad

Lcda. Emma Mendieta

Lcda. Liriola Guillén

Ing. Rouxana Young

Ing. María del Pilar Pinilla

Apoyo Técnico

Téc. Ricardo Johnston - DITIC

Unidades Coordinadoras de Proyectos

Vicerrectoría Académica

Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación

Dirección General de Planificación Universitaria

Dirección General de Ingeniería y Arquitectura

Dirección General de Recursos Humanos

Dirección del Sistema de Estudios de Postgrado

Dirección de Relaciones Internacionales

Dirección de Investigación

Dirección de Extensión

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	v
1. Procedimiento empleado	1
2. Síntesis de cumplimiento del PMIA por factor.....	5
3. Análisis de Cumplimiento del PMIA.....	14
ANEXOS	21
Anexo 1. Listado de Evidencias	
Anexo 2. Cuadros de Resumen de Seguimiento al Cumplimiento del PMIA	
Anexo 3. Cuadros de Registro de Avance Ejecutado por Proyecto y Actividad	
Anexo 4. Evidencias (digitalizadas)	

INTRODUCCIÓN

El Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado (PMIA) 2012-2016 de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), es el resultado de los ajustes realizados al Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), entregado inicialmente al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA) con el Informe de Autoevaluación Institucional. El PMIA considera las recomendaciones realizadas por la comisión de pares académicos encargados de la Evaluación Externa; así como proyectos, actividades y acciones en las que se detectaron condiciones susceptibles de mejora dentro de la Universidad.

Este Plan reúne un conjunto de proyectos, y describe actividades, metas, establece cronogramas, asigna responsables, recursos e indicadores de seguimiento; procurando elevar la calidad, pertinencia y eficiencia de los servicios que brinda la Universidad a la sociedad panameña.

El PMIA contiene veintiún (21) proyectos, que responden a los cuatro (4) Factores de la Matriz de Autoevaluación Institucional de CONEAUPA, que son: Docencia Universitaria con cuatro (4) proyectos, Investigación e Innovación con siete (7), Extensión Universitaria con cuatro (4) y Gestión Institucional con seis (6).

La labor de medición y seguimiento del cumplimiento del PMIA, la realiza la Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación (UTEA), del Departamento de Evaluación y Calidad de la Dirección General de Planificación Universitaria (DIPLAN), en conjunto con las siguientes unidades Coordinadoras de Proyectos, que en total son nueve (9): Vicerrectoría Académica, Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación, Dirección General de Planificación Universitaria, Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Ingeniería y Arquitectura, Dirección de Relaciones Internacionales, Dirección del Sistema de Estudios de Postgrado, Dirección de Investigación y Dirección de Extensión.

El periodo de medición y seguimiento que comprende el presente informe es del 1 de junio 2015 al 31 de mayo 2016, e involucró veinte (20) proyectos de los veintiún (21) que conforman el PMIA, desarrollados a través de noventa y cuatro (94) actividades; adicional, se reportan siete (7) actividades cuya fecha de ejecución corresponde al periodo anterior, pero se concluyeron en este periodo, y se reportaron con conclusión tardía.

En términos de cumplimiento acumulativo, el PMIA debió haber alcanzado 93.60%; sin embargo, logró avanzar 84.15%, reflejando un estado de cumplimiento con **Avance Parcial**, que indica que el cumplimiento logrado es menor que el programado, mostrando un retraso de 9.45%, lo cual clasifica en un nivel de riesgo bajo.

Los resultados acumulados del avance de los veintiún (21) proyectos del PMIA hasta el período en estudio (31 de mayo 2016), muestran el siguiente nivel de cumplimiento: once (11) proyectos mantienen un estado de **avance parcial**, que indica un cumplimiento logrado menor que el programado; nueve (9) proyectos lograron un estado de **avance satisfactorio**, mostrando que los proyectos tuvieron un cumplimiento en correspondencia con el programado; mientras que un (1) proyecto con **conclusión satisfactoria**, ya que culminó de acuerdo con la fecha de finalización. Es importante resaltar que no existen proyectos **sin registro de avance**, indicando que todos los proyectos involucrados en el PMIA están siendo ejecutados.

A continuación se presenta el Informe de Cumplimiento al PMIA de la UTP, el cual contiene los antecedentes, la metodología que se empleó en la medición y seguimiento, una síntesis del cumplimiento por factor, el análisis estadístico de cumplimiento y los anexos con listado de evidencias y cuadros con el cumplimiento por proyecto y el resumen de seguimiento y control del PMIA.

El Cuarto Informe de Cumplimiento del PMIA del periodo 1 de junio 2015 al 31 de mayo 2016 se presenta en forma impresa y digital; mientras que las evidencias se entregan de forma digital.

1. PROCEDIMIENTO EMPLEADO

La labor de **medición y seguimiento** del cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado (PMIA) 2012-2016 de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la realiza la Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación (UTEA) de la Dirección General de Planificación Universitaria (DIPLAN), a través de un Sistema Automatizado de Seguimiento vía Web, el cual permite a las Unidades Coordinadoras valorar en forma sistemática la ejecución y avance del PMIA, al plazo señalado.

El criterio aplicado en el seguimiento, para determinar el estado de la actividad formulada, se aplica en los siguientes niveles:

- **Nivel de actividades¹:** Porcentaje de cumplimiento logrado de las actividades previstas dentro del plazo de corte señalado, restricciones (humanas, materiales, financieras) encontradas durante la ejecución de las actividades, acciones correctivas aplicadas para reforzar o agilizar el mejoramiento esperado y listado de evidencias particulares que respaldan el avance logrado.
- **Nivel de proyectos:** Valoración general de los resultados y avances obtenidos a la fecha de corte de la medición y seguimiento, y observaciones generales aplicables (explicaciones, aclaraciones, medidas alternativas y otros).

Para éste Cuarto Informe de Cumplimiento, el proceso de **medición y seguimiento** del PMIA, comprende los siguientes pasos:

- Elaboración de Cronograma de Actividades.
- Reunión de Inducción al Sistema Automatizado de Seguimiento al PMIA con los enlaces de las unidades coordinadoras de proyectos del PMIA.
- Notificación a las unidades coordinadoras de proyectos, de la apertura del período de reporte de avances del PMIA y solicitud de la documentación.

¹ La medición y seguimiento al nivel de actividades del PMIA se realiza de forma independiente a cada uno de los ciclos en los que puede estar compuesta una actividad repetitiva formulada dentro de un Proyecto. Para el caso de actividades no repetitivas, se realiza el seguimiento sólo a la actividad única.

- Período de registro de avance por parte de las unidades coordinadoras de proyectos. Captura y actualización en el Sistema Automatizado vía Web de Seguimiento al PMIA de las actividades por proyecto.
- Entrega de evidencias en archivos digitales de los avances registrados por las Unidades Coordinadoras.
- Acompañamiento por parte del personal de la UTEA, a los enlaces de las dependencias responsables de coordinar proyectos, en el proceso de reporte de cumplimiento del PMIA.
- Consolidación y revisión analítica de los logros reportados y de los respaldos de la evidencia entregados.
- Generación de resumen de seguimiento y control.
- Desarrollo del Informe de Cumplimiento a entregar a CONEAUPA.
- Presentación de los resultados del proceso a las autoridades universitarias.
- Entrega a CONEAUPA del Informe de Cumplimiento del período en estudio.
- Colocar en la Página Web de la UTP, sitio de Acreditación el Cuarto Informe de Seguimiento, del período en estudio, <http://www.utp.ac.pa/plan-de-mejoramiento-institucional>.

A continuación se hace una breve descripción de los criterios aplicados en cada aspecto de la **medición y seguimiento** del cumplimiento del PMIA de la UTP:

- **Fecha de inicio de la actividad [FIA]:** Corresponde a la fecha programada de inicio de la actividad.
- **Fecha de finalización de la actividad [FFA]:** Corresponde a la fecha programada de finalización de la actividad.
- **Fecha de corte para medición y cumplimiento [FC]:** Corresponde a la fecha de corte en que se hace la medición y seguimiento del PMIA.
- **Porcentaje de ejecución programado de la actividad a la fecha de corte [PEPA]:** Corresponde al cálculo del porcentaje que se espera logre la actividad según su evaluación de [FIA], [FFA] y [FC].

- **Porcentaje de ejecución logrado de la actividad [PELA]:** Corresponde a la valoración que hace la Unidad Coordinadora respecto al porcentaje de ejecución logrado de la actividad a la fecha de corte [FC].
- **Estado de la actividad/proyecto:** Se determina de acuerdo a los siguientes niveles de cumplimiento:

ESTADO	DESCRIPCIÓN
CONCLUSIÓN SOBRESALIENTE (CSO)	El proyecto o actividad ha culminado por adelantado a la fecha de finalización programada.
CONCLUSIÓN SATISFACTORIA (CSA)	El proyecto o actividad ha culminado de acuerdo con la fecha de finalización programada.
CONCLUSIÓN TARDÍA (CTA)	El proyecto o actividad ha culminado posterior a la fecha de finalización programada.
AVANCE SOBRESALIENTE (ASO)	El proyecto o actividad se encuentra en ejecución y con un porcentaje de cumplimiento logrado mayor al programado.
AVANCE SATISFACTORIO (ASA)	El proyecto o actividad se encuentra en ejecución y con un porcentaje de cumplimiento logrado igual al programado.
AVANCE PARCIAL (APA)	El proyecto o actividad se encuentra en ejecución y con un porcentaje de cumplimiento logrado menor al programado.
SIN AVANCE (SAV)	El proyecto o actividad le correspondía ejecución en el período evaluado, y no registró ningún avance en el porcentaje de cumplimiento logrado.
EJECUCIÓN POSTERIOR (EPO)	El proyecto o actividad no le correspondía iniciar ejecución en el período evaluado.

- **Nivel de riesgo de la actividad/proyecto:** Se determina de acuerdo a la siguiente Clasificación:

NIVEL DE RIESGO	DESCRIPCIÓN
BAJO	La actividad / proyecto de mejoramiento no se ha cumplido en las condiciones y fechas predefinidas, presentando un retraso de entre 0.01% y 25.00% a la fecha de corte de la medición y seguimiento.
MEDIO	La actividad / proyecto de mejoramiento no se ha cumplido en las condiciones y fechas predefinidas, presentando un retraso de entre 25.01% y 50.00% a la fecha de corte de la medición y seguimiento.
ALTO	La actividad / proyecto de mejoramiento no se ha cumplido en las condiciones y fechas predefinidas, presentando un retraso de entre 50.01% y 75.00% a la fecha de corte de la medición y seguimiento.
MUY ALTO	La actividad / proyecto de mejoramiento no se ha cumplido en las condiciones y fechas predefinidas, presentando un retraso de entre 75.01% y 100.00% a la fecha de corte de la medición y seguimiento.

2. SÍNTESIS DE CUMPLIMIENTO DEL PMIA, POR PROYECTO

En este periodo se evaluó un total de veinte (20) proyectos. Los resultados se detallan a continuación:

FACTOR 1. DOCENCIA UNIVERSITARIA.

Proyecto 1: Desarrollo de Estudios de Demanda Laboral en Ingeniería y Tecnología

Resultados: El Proyecto "Estudio de Demanda y Oferta de Profesionales, Técnicos y de Servicios de Extensión en la República de Panamá, año 2015", permitirá determinar la demanda y oferta de profesionales en ingeniería y tecnología que el país requiere. El estudio se encuentra actualmente en la fase de análisis de la información de los datos recolectados, para la elaboración del Documento final a presentarse a finales del mes de agosto 2016.

Observaciones: Este Estudio ha sido reprogramado debido a actividades prioritarias que desarrolla la Unidad ejecutora, afectando el cronograma de actividades establecido inicialmente, queda pendiente reportar la última actividad denominada "Análisis de la información y elaboración del Documento Final", que será entregado a finales del mes de agosto 2016.

Proyecto 2: Actualización e implementación de la guía para la elaboración de los programas de asignaturas

Resultados: Proyecto concluido en el período 1 de junio 2013 a 31 de mayo 2014.

Proyecto 3: Actualización y perfeccionamiento del personal docente

Resultados: En el receso académico se ofrecieron cursos en Moodle y Jornada de Actualización para docentes en las Facultades y Centros Regionales; Curso Virtual en Docencia Superior; así como, capacitaciones en el idioma inglés, conducentes al perfeccionamiento del personal docente a nivel nacional.

Observaciones: Está en proceso, la realización de un diagnóstico de necesidades de formación del personal docente y el establecimiento de mecanismos para el seguimiento, evaluación y control de las capacitaciones.

Proyecto 4: Sistema de Evaluación del desempeño docente y la conectividad con los procesos de selección, capacitación y contratación

Resultados: El Sistema automatiza la captación y procesamiento de las evaluaciones realizadas por el estudiante, el Jefe de Departamento y el propio docente (autoevaluación), permitiendo calcular la ponderación asignada a cada una de las evaluaciones, además de generar el reporte con la evaluación final.

Observaciones: Por motivos de falta de recurso humano, no se ha podido avanzar en la programación de los módulos de selección y capacitación, los cuales integrarán todo el Sistema para el logro de la conectividad.

FACTOR 2. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.

Proyecto 5: Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Resultados: El Proyecto se ha podido realizar de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Investigación. Entre las actividades de divulgación y apoyo a la I+D+i que se han desarrollado para dar respuesta a este proyecto están: los Ciclos de Conferencia en I+D+i, Taller de Escritura de Artículos Científicos, Feria Informativa, Congreso de Ciencia y Tecnología; así como la publicación del Volumen II de la Revista I+D+i del 2015, la cual se encuentra alojada y disponible en el sitio web de la UTP.

Observaciones: N/A

Proyecto 6: Sistematización de la información relativa al grado de participación de los estudiantes de postgrado en trabajos de investigación

Resultados: Se consolidó la información recibida de Centros Regionales y Facultades; con lo cual, se elaboró el cuadro resumen de participación de estudiantes de postgrado en trabajos de investigación, obteniéndose el indicador basado en una muestra representativa del total de estudiantes que cursan programas de postgrado.

Observaciones: Se ha tenido dificultad para recopilación de la información tanto en Facultades como en Centros Regionales, la DSEP analizará estrategias conducentes a la obtención de la información.

Proyecto 7: Fortalecimiento de los grupos de investigación y de estudio.

Resultados: El programa ha logrado la formación de nuevos grupos de investigación y la inserción de estudiantes a estos. A través de la Jornada de Investigación Científica (JIC), se promueve la participación de los estudiantes en las áreas de investigación, también se creó la Revista de Iniciación Científica (RIC), para que los estudiantes puedan hacer sus publicaciones.

Observaciones: Como se explicó en el periodo anterior, las actividades que originalmente se programaron para desarrollar este proyecto no se han podido llevar a cabo debido a la falta de fondos en la institución; sin embargo, la UTP sustenta el proyecto, con otras actividades que le permiten cumplir con el objetivo por el cual fue concebido.

Proyecto 8: Desarrollo e implementación de un Sistema de información de convenios y acuerdos nacionales e internacionales

Resultados: Los convenios han sido actualizados en el sistema. La Dirección de Tecnología de Información y Comunicación (DITIC), realizó la migración de la información de la aplicación de Convenios, la cual se encuentra en el Sitio de Convenios Nacionales e Internacionales, la misma está en funcionamiento y permite actualizar los convenios en línea y retirarlos de forma automática. DITIC, programó una capacitación para el 18 de mayo de 2016 con el personal de la Dirección de Extensión y Relaciones Internacionales para concluir y dar las indicaciones a seguir para el manejo del sistema.

Observaciones: N/A.

Proyecto 9: Sistema de reconocimiento para investigadores de la UTP a través del Programa de Incentivos, Estímulos y Premiación a la Investigación.

Resultados: En el 2015 se hizo un reconocimiento al Investigador del año y a los mejores trabajos de tesis por Facultad, distinguiendo a los estudiantes y sus asesores. Se realizó reconocimiento a los estudiantes que participaron en la Jornada de Iniciación Científica (JIC), el grupo ganador recibió aporte para representar a la institución fuera del país. Para el 2016 se continúa con el programa de descargas horarias a los docentes que realizan investigación, como parte de los estímulos por dedicarse a la investigación.

Observaciones: El programa de incentivos, estímulos y premiación a la investigación, está en proceso de estructuración; sin embargo, los objetivos del proyecto se están logrando a través de otras actividades.

Proyecto 10: Adquisición de Software con Licencias para la UTP

Resultados: La UTP ha continuado con el proceso de adquisición e instalación de una serie de software actualizado y con licenciamiento para las diferentes instancias universitarias (docencia, investigación, extensión y administración) a nivel nacional, ha permitido iniciar el proceso de estandarización de los softwares requeridos para satisfacer las necesidades en esta materia. A la fecha se han adquirido e instalado una gran cantidad de software de ofimática y software especiales.

Observaciones: El cambio de administración en la Unidad Coordinadora del Proyecto, ha dado lugar a la designación de nuevo personal responsable del Proyecto, y se está trabajando en aras de retomar lo realizado con anterioridad y darle continuidad a las acciones requeridas para el cumplimiento de lo pactado. Se han realizado los trámites necesarios para la inclusión en el Presupuesto 2017 de la compra de Licencias de Software y se ha avanzado en la adquisición de software para el año 2016.

Proyecto 11: Programa Institucional para el fortalecimiento de las actividades de investigación e innovación

Resultados: El Programa UTP-Investiga, que forma parte de este Proyecto 11, no ha contado con presupuesto para su desarrollo. Sin embargo, se han realizado otras actividades que han permitido lograr el objetivo del mismo. Dentro de las actividades propuestas para fortalecer las actividades de investigación, está el financiamiento del programa de Jornada de Investigación Científica (JIC), con el apoyo de SENACYT. Las descargas horarias, que permite a los docentes realizar investigación, se han cumplido.

Observaciones: N/A.

FACTOR 3. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Proyecto 12: Desarrollo de Estudios de Necesidades de Extensión y Servicio a la Sociedad

Resultados: Con el Proyecto "Estudio de Demanda y Oferta de Profesionales, Técnicos y de Servicios de Extensión en la República de Panamá, año 2015", se determinarán la demanda potencial de servicios de extensión, a través de sus sectores productivos. Se encuentra actualmente en la fase de análisis de la información de los datos recolectados, para la elaboración del Documento final, que será entregado a finales del mes de agosto 2016.

Observaciones: Este Estudio ha sido reprogramado debido a actividades prioritarias que desarrolla la Unidad ejecutora, afectando el cronograma de actividades establecido inicialmente, queda pendiente reportar el último indicador denominado "Análisis de la información y elaboración del Documento Final", para entrega a finales del mes de agosto 2016.

Proyecto 13: Implementar un Sistema de Información en el marco de la internacionalización

Resultados: Se llevaron a cabo las Sesiones Informativas en el Campus Central Víctor Levi Sasso de la UTP y en los Centros Regionales de Chiriquí, Coclé, Azuero y Veraguas, beneficiando a los estudiantes asistentes. De igual manera, se logró que a través del Programa "Semillas para el Futuro" la Compañía Huawei de China ofreciera una charla informativa a estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales y la Facultad de Ingeniería Eléctrica permitiendo que estudiantes tengan la oportunidad de viajar a Beijing, China y vivir experiencias en la Compañía por tres (3) semanas. También es importante resaltar, que durante este periodo se llevó a cabo la I y II Feria de Becas y Oportunidades Internacionales donde se contó con exhibición de stands y ronda de conferencias de embajadas de países acreditadas en nuestro país, así como la participación de instituciones que ofrecen becas a panameños.

Las redes sociales (Facebook y Twitter) se han vuelto una parte integral en los jóvenes y se trabajó en la modificación de la imagen de enlace de Facebook "UTP SIN FRONTERA" A "UTP INTERNACIONAL" para tener un mayor efecto, logrando que 3,374 personas visitaran la página y permitiendo que los eventos organizados por la DRI, sean vistos y tengan una mayor participación de los estudiantes; tanto de la Sede Central Panamá, como en los Centros Regionales se cuenta con 1,342 seguidores en Twitter.

También se levantaron folletos de información como "Programas de Movilidad Estudiantil de la UTP al Exterior", STUDY ABROAD IN PANAMA y volantes informando sobre las Becas para intercambio estudiantil en Europa (SUSTAIN Y CRUZ DEL SUR). Así mismo, se levantó un Catálogo de Capacidades en las áreas de Investigación para ser distribuidos en las reuniones y eventos desarrollados.

Observaciones: N/A.

Proyecto 14: Desarrollo e implementación de un Sistema web de gestión de egresados y graduados UTP

Resultados: El Sistema ALUMNI UTP, será reemplazado por el "Sistema de Seguimiento y Actualización de Egresados" (SISAE) utilizado en el Centro Regional de Azuero, el cual está siendo adecuado a los requerimientos tanto de Facultades, VRA, DIPLAN y la Dirección de Extensión para el seguimiento a egresados. Cabe señalar que se incorporará un buzón de sugerencias sobre los servicios a egresados, con el cual se realizará el monitoreo del Sistema.

El estatus actual del "Sistema de Seguimiento y Actualización de Egresados" (SISAE), se encuentra en la fase de validación de Módulos: Controles de seguridad, usuario de egresados, ingresar coordinador de la Carrera por Facultad, Consulta de Egresados, Publicación de noticias, Control de asistencia de los egresados, link de la bolsa de trabajo e incorporación de un buzón de sugerencias, sobre los servicios a egresados

Observaciones: N/A.

Proyecto 15: Reactivación de Asociación de Egresados de la UTP (ASETEC) y su vinculación con los egresados y graduados.

Resultados: Se protocolizó mediante el Registro Público la Escritura de la Junta Directiva 2013-2015 para su inscripción, sin embargo no se ha podido reactivar la Asociación de Egresados (ASETEC), debido a que no se han culminado trámites legales para lograr la inscripción de la junta Directiva.

Observaciones: N/A.

FACTOR 4. GESTIÓN INSTITUCIONAL.

Proyecto 16: Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2013-2017

Resultados: Para el año 2015, se presentó un informe preliminar. Se registró el 48% del total de indicadores que conforman el Plan de Desarrollo Institucional, en donde el 41.77% corresponde al Plan Académico y el 6.33% al Plan de Gestión. Dentro de este logro se registran indicadores que no se habían medido anteriormente, lo cual representa un avance para el registro de información valiosa que nos permita orientar la hoja de ruta para el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad Tecnológica de Panamá, teniendo presente que el PDI es un documento indicativo, flexible y dinámico que marca el horizonte a seguir en los próximos años.

Observaciones: En la actualidad, de acuerdo a lo expuesto en cuanto a la rotación de personal, nos mantenemos en comunicación con la persona asignada en reemplazo del enlace que administraba la información de los indicadores de la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento (DGTC) y Centro de Emprendimiento, en busca de obtener la información para estos indicadores a la mayor brevedad posible. Esta información corresponde al 20% de los indicadores pendientes por medir.

Para el informe 2016 se estará registrando información de acuerdo a la periodicidad de la medición en cada indicador, en busca de aminorar el tiempo de generación de información para cada uno de ellos. Se estarán revisando los indicadores que conforman el PDI, con sus objetivos y avances con la finalidad de identificar si alguno de ellos requiere ser modificado o eliminado a través de la evaluación de sus logros durante el período. Esta acción se espera llevar a cabo con el apoyo de las diferentes unidades involucradas y el personal de la Dirección General de Planificación Universitaria.

Proyecto 17: Desarrollo e implementación de un Sistema Web de registro y seguimiento a la capacitación y desarrollo del recurso humano de la UTP.

Resultados: Se capacitó a los usuarios potenciales de la Aplicación y tanto el administrador de la aplicación (Departamento de Capacitación y Desarrollo de la UTP), como unidades Administrativas de Alta Jerarquía, se están viendo beneficiados por dicha aplicación.

Observaciones: Debido al alto volumen de información que se debía procesar, adicional a la falta de recurso humano y equipo Técnico disponible se produjo un retraso en el cumplimiento de

algunas de las etapas del proyecto, situación que finalmente fue corregida logrando poner el Aplicativo Web de Registro y Seguimiento a la Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano de la UTP en funcionamiento y al servicio de los Usuarios Potenciales Finales, en su primera versión.

Proyecto 18: Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (PMDI)

Resultados: La Dirección General de Ingeniería y Arquitectura, contribuye a la ejecución de diversos proyectos para la UTP a nivel nacional como lo son: Construcción del edificio para la Dirección de Tecnología de la Información - DITIC, edificio para los Centros de Investigación, se trabaja en el suministro e instalación de ascensores panorámicos para los edificios N°1 y N°3, se acondicionan aires acondicionados para todas las instalaciones en el Campus Víctor Levi Sasso, se construyen y acondicionan facilidades para toda la comunidad universitaria como son las canchas deportivas, ampliación de aceras, puente peatonal, acondicionamiento de todos los sistemas sanitarios. En los Centros Regionales, se licitó el edificio de aulas de Panamá Oeste y se acondiciona el Taller de Eléctrica, en Chiriquí.

Observaciones: Se envían informes, documentación y fotos que sustentan el avance de los diversos proyectos para el período comprendido desde el 1 de junio de 2015 al 30 de abril de 2016.

Proyecto 19: Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la UTP

Resultados: La Institución cada año asigna los fondos para el equipamiento y actualización de los laboratorios de Facultades y Centros Regionales. Las mejoras pretenden mantener el alto nivel de aprendizaje de los estudiantes, mediante el uso de equipos actualizados utilizados en el mercado laboral, además de fortalecer lo requerido para los procesos de acreditación nacional e internacional.

Observaciones: N/A.

Proyecto 20: Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Laboratorios y Talleres a nivel nacional

Resultados: Para este periodo se ha continuado con la ejecución de los trabajos de mantenimiento de los laboratorios de las Facultades y de los Centros Regionales con el objetivo de seguir brindando un servicio de Calidad a la comunidad estudiantil.

En el año 2016, por medio del Presupuesto Ley de Inversiones se asignó B/.285,580.00 para el Proyecto Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales. Al mes de abril de 2016 tuvo una ejecución de B/.109,294.83

Observaciones: N/A.

Proyecto 21: Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Resultados: La disponibilidad de bases de datos bibliográficas y colecciones digitales existentes, a través de la biblioteca, fortalecen los procesos que realizan los sectores académicos y de investigación.

Observaciones: El acceso a las bases de datos contribuye al posicionamiento del ranking de la Universidad Tecnológica de Panamá.

3. ANÁLISIS DE LOS CUADROS QUE MUESTRAN EL CUMPLIMIENTO DEL PMIA (VER ANEXOS 2 Y 3)

3.1 GENERALIDADES DEL PMIA PARA EL PERÍODO EN ESTUDIO

3.1.1 Proyectos y actividades sujetas a participación en el período

La ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado (PMIA), para el periodo del 1° de junio 2015 al 31 de mayo 2016, supuso la participación de un Total de **20 proyectos** programados con **noventa y cuatro (94)** actividades a desarrollar.

**PMIA – 1° de junio 2015 al
31 de mayo 2016**

**20 proyectos
94 actividades**

El Factor Investigación e Innovación registra la mayor cantidad de proyectos con participación durante el período, con siete (7) proyectos, seguido de los factores de Gestión Institucional seis (6), Docencia Universitaria tres (3) y Extensión Universitaria con cuatro (4) proyectos.

PORCENTAJE DE PROYECTOS POR FACTOR

Docencia	3	15%
Investigación	7	35%
Extensión	4	20%
Gestión	6	30%

En concordancia con lo anterior, se observa que la mayor cantidad de actividades sujetas a participación en el período, se clasifican también dentro del Factor de Investigación e Innovación (39.36%), seguido del Factor de Gestión Institucional Universitaria (27.66%), Extensión Universitaria (19.15%) y Docencia Universitaria (13.83%).

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES SUJETAS A PARTICIPACIÓN POR FACTOR

Docencia	13	13.83%
Investigación	37	39.36%
Extensión	18	19.15%
Gestión	26	27.66%

3.1.2 Actividades sujetas a conclusión


Para el período en estudio, son **ochenta y un (81)** las actividades sujetas a conclusión, y la mayor cantidad le corresponde al Factor Investigación e Innovación (40.74%), seguido del Factor de Gestión Institucional Universitaria (27.16%), Extensión Universitaria (17.28%) y Docencia Universitaria (14.82%).

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES SUJETAS A CONCLUSIÓN POR FACTOR

Docencia	12	14.82%
Investigación	33	40.74%
Extensión	14	17.28%
Gestión	22	27.16%

3.2 RESULTADOS DEL PLAN PARA EL PERÍODO EN ESTUDIO

3.2.1 NIVEL DE PROYECTOS

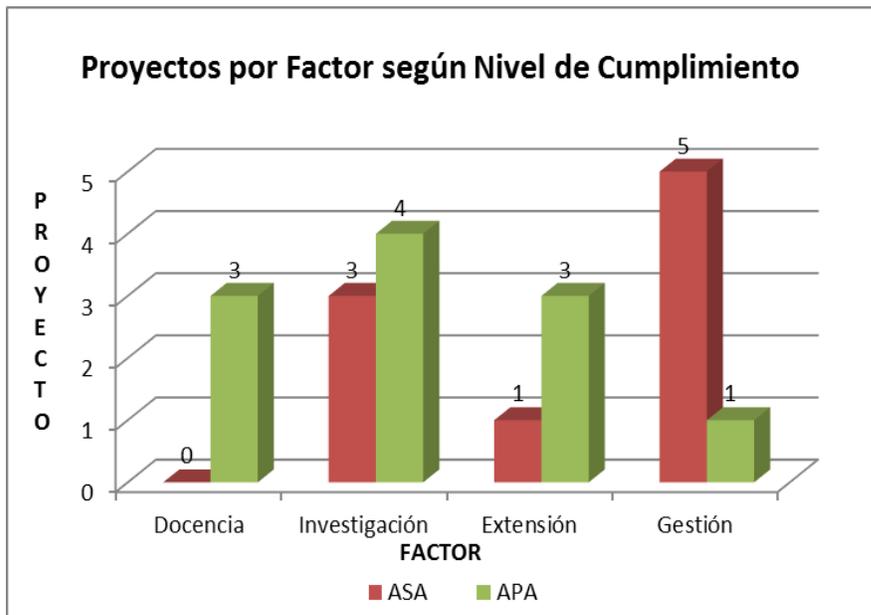

El total de **proyectos involucrados** con avances reportados en el período en estudio es de **veinte (20)**. Los resultados del seguimiento indican que **once (11)** proyectos registraron un **avance parcial (APA)**, es decir, el cumplimiento es menor que el programado. Los Factores Docencia Universitaria y

Extensión Universitaria registran cada uno tres (3) proyectos con avance parcial; mientras el Factor Investigación e Innovación, cuatro (4) proyectos y Gestión Institucional un (1) proyecto.

Nueve (9) proyectos tuvieron un **avance satisfactorio (ASA)**, indicando que su ejecución en el periodo estuvo acorde con lo programado. El Factor Gestión Institucional logró cinco (5) proyectos con avance ASA; Investigación e Innovación logró tres (3) y Extensión Universitaria un (1) proyecto.

3.2.2 NIVEL DE ACTIVIDADES

3.2.2.1 Actividades Involucradas

Hasta el período en estudio (31 de mayo 2016), fueron **ciento uno (101)** las actividades involucradas con reporte de parte de las unidades coordinadoras de proyectos.

Noventa y cuatro (94) actividades corresponden a las actividades con participación en el periodo del 1 de junio 2015 al 31 de mayo 2016 y **siete (7)** son actividades de periodos anteriores, que no habían alcanzado el nivel de

avance, ya que fueron reprogramadas. Las unidades coordinadoras sustentaron la situación que habían confrontado con estas actividades en el Tercer Informe de Avance (Proyectos N°1, N°12 y N°17).

<u>ESTADO DE ACTIVIDADES</u> <u>INVOLUCRADAS EN EL PERIODO</u>		
<i>Conclusión satisfactoria</i>	55	54.46%
<i>Conclusión tardía</i>	7	6.93%
<i>Con Avance satisfactorio</i>	8	7.92%
<i>Con Avance parcial</i>	19	18.81%
<i>Sin Avance</i>	12	11.88%

3.2.2.2 Actividades Concluidas

Del total de actividades involucradas, **ochenta y ocho (88)** les correspondía conclusión. De estas se concluyeron **sesenta y dos (62)** actividades; **cincuenta y cinco (55)** alcanzando un nivel de **conclusión satisfactorio (CSA)**, es decir, significa que culminaron de acuerdo con la fecha programada y **siete (7)** con **conclusión tardía (CTA)**, dado que debían concluir en el periodo anterior.

Los Factores Investigación e Innovación y Gestión Institucional fueron los que más actividades concluidas reportaron en el período, representan 40.32% y 37.10%, respectivamente; seguidos por el de Extensión Universitaria con el 14.52% y Docencia Universitaria con 8.06%.

<u>CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES</u> <u>CONCLUIDAS POR FACTOR</u>		
<i>Docencia</i>	5	8.06%
<i>Investigación</i>	25	40.32%
<i>Extensión</i>	9	14.52%
<i>Gestión</i>	23	37.10%

Con el resultado logrado en este periodo, se obtiene un acumulativo de actividades concluidas de **trecientas diez (310)**, de las cuales **cuatro (4)** han logrado un nivel de cumplimiento con conclusión sobresaliente (**CSO**), **doscientos noventa y nueve (299)** con conclusión satisfactoria (**CSA**) y **siete (7)** con conclusión tardía (**CTA**); representando el 79.08% del total de actividades formuladas.

3.2.2.3 Actividades con avance satisfactorio (ASA)


Ocho (8) de las actividades sujetas a participación registraron un **avance satisfactorio**, continuando para el siguiente período. De éstas, el 62.5% correspondió al Factor Gestión Institucional, seguido del Factor Investigación e Innovación con 25.0% de ellas y 12.5% al Factor Extensión Universitaria.

3.2.2.4 Actividades con avance parcial (APA)

En el periodo, **diecinueve (19)** de las actividades tuvieron **avance parcial**; es decir, el porcentaje de cumplimiento logrado es menor que el programado; en donde el Factor Investigación e Innovación refleja el 52.63%; Extensión Universitaria 26.32%, Docencia Universitaria 15.79% y el Factor Gestión Institucional 5.26%.

3.2.2.5 Actividades sin avance (SAV)

Los resultados muestran que **doce (12)** actividades fueron reportadas **sin avance**, en otras palabras no se ejecutaron durante el periodo evaluado. Siete (7) de estas actividades sin avance pertenecen a proyectos dentro del Factor Docencia Universitaria; mientras que cinco (5) son del Factor Extensión Universitaria. Los otros dos Factores no reportaron actividades sin avance.

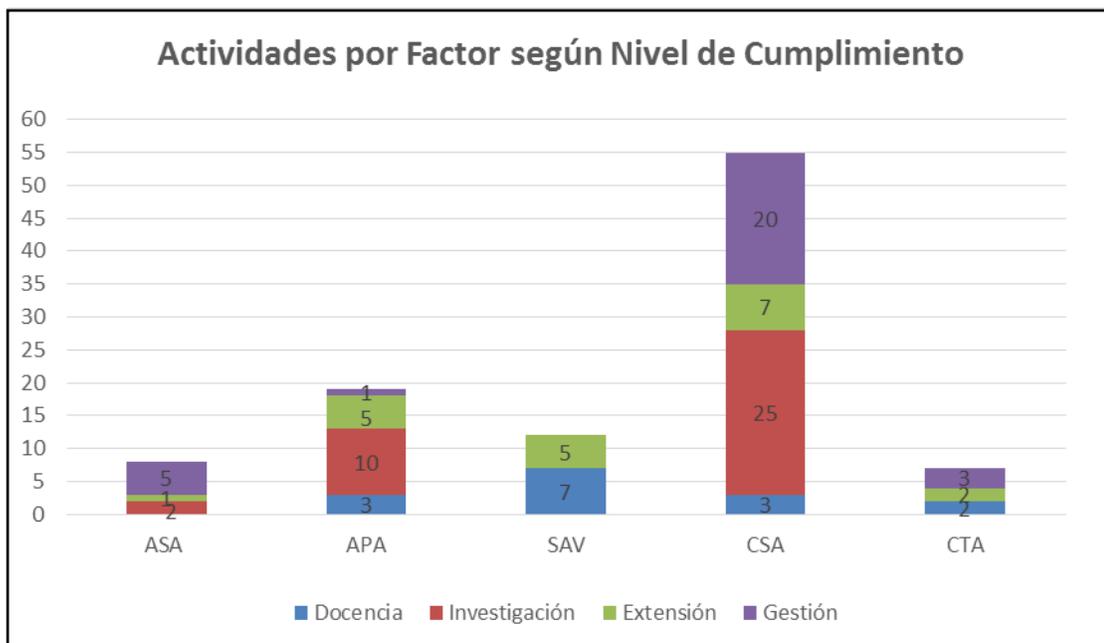

3.2.2.6 Actividades que le correspondía finalizar hasta el período en estudio y no lograron concluir

Un total de **veintiséis (26)** actividades que le correspondían finalizar en el período no lograron su conclusión. De éstas, 34.62% corresponden al Factor Docencia Universitaria, a los Factores Investigación e Innovación y Extensión Universitaria, 30.77% en cada uno y 3.84% a Gestión Institucional.

3.3 CUMPLIMIENTO DEL PMIA

3.3.1 Porcentaje y nivel de cumplimiento por Factor


Hasta el periodo en estudio (31 de mayo 2016), el PMIA debió haber alcanzado un cumplimiento acumulado del 93.60%; sin embargo, logró avanzar 84.15%, reflejando un estado de cumplimiento con **Avance Parcial**, que indica que el cumplimiento logrado es menor que el programado, mostrando un **retraso de 9.45%** de lo programado, lo cual clasifica en un **nivel de riesgo bajo** (ver página 11).

El período en estudio debió haber aportado un 19.09% al cumplimiento del PMIA; sin embargo, aportó 17.3%.

El retraso en la ejecución se sustenta por las restricciones presupuestarias por las que se ha atravesado para la ejecución de los proyectos, principalmente los del Factor Investigación e Innovación. No obstante, es importante señalar que al igual que para el periodo anterior, se realizó un análisis de algunas actividades, tales como: convocatorias, negociación y adjudicación de propuestas avaladas para proyectos y grupos de investigación las cuales no se ejecutaron; sin embargo, evaluando los objetivos de los proyectos (específicamente los proyectos N°7, N°9 y N°11) se pudo constatar que la universidad continua con el fortalecimiento de la investigación a través de la creación de grupos multidisciplinarios y de estudios, los cuales están realizando investigaciones por medio de docentes, estudiantes e investigadores de esta universidad.

Se están desarrollando actividades como las Jornadas de Iniciación Científica (JIC), publicaciones en la Revista de Iniciación Científica (RIC), Ciclos de Conferencia en I+D+i, Taller de Escritura de Artículos Científicos, Feria Informativa, Congreso de Ciencia y Tecnología; así como la publicación del Volumen II de la Revista I+D+i, la cual se encuentra alojada y disponible en el sitio web de la UTP. Se destinan fondos para la ayuda a la contratación de asistentes de investigación, y se realizó por primera vez la premiación al investigador destacado y a las mejores tesis, una por cada Facultad, a fin de incentivar que más estudiantes realicen esta opción como Trabajo de Graduación.

Igualmente, actividades que habían sido reprogramadas en el periodo anterior por razones de prioridades surgidas en la unidades ejecutoras, lograron concluirse, no obstante actividades posteriores quedaron para ser ejecutadas en el próximo periodo por razones de la reprogramación (Proyectos N°1 y N°12). En otros casos, se está realizando migración de plataforma para el seguimiento de egresados (Alumni), a un Sistema de Seguimiento y Actualización de Egresados (SISAE), el cual es un sistema integrado de gestión de egresados, provocando esta acción retrasos en la ejecución de las actividades del Proyecto N°14.

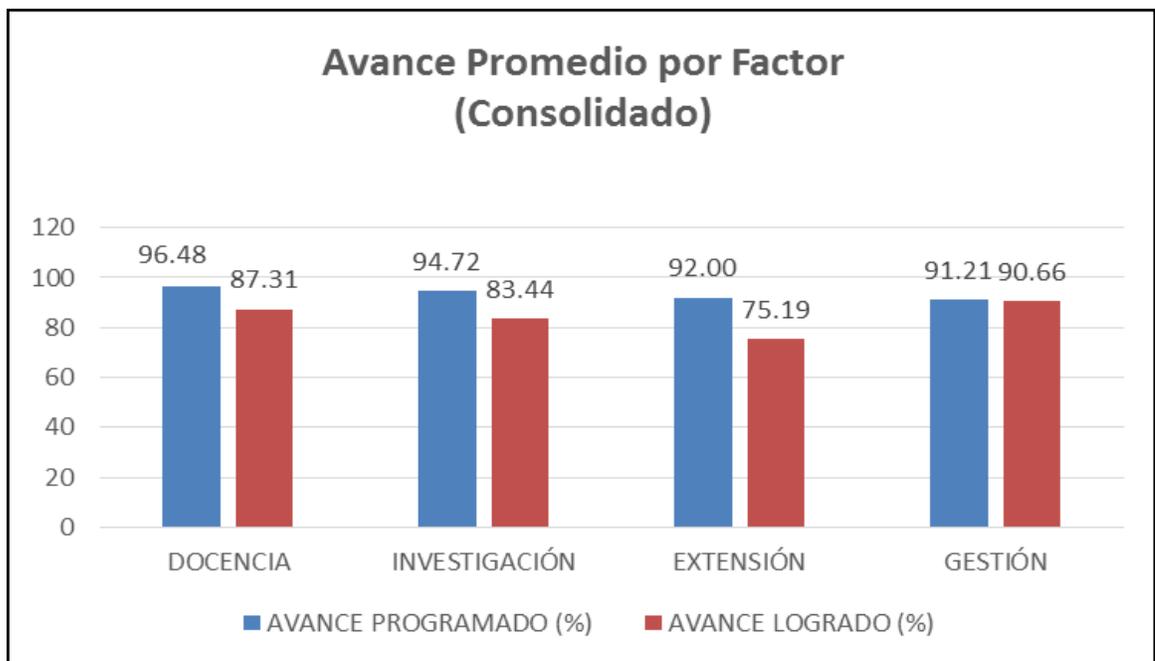


A nivel de Factores, se observa que los cuatro Factores Docencia Universitaria, Investigación e Innovación, Extensión Universitaria y Gestión Institucional, registran un estado de proyectos acumulado con **avance parcial (APA)**, ya que el avance logrado está por debajo del avance programado.

En el Factor Gestión Institucional se observa que el porcentaje de avance logrado 90.66% es el más cercano al avance programado que es de 91.21%; a nivel de proyectos en este factor se obtuvo que cinco (5) proyectos tuvieron **avance satisfactorio (ASA)** es decir, que lograron alcanzar el avance programado y solo uno (1) tuvo **avance parcial (APA)**, presentando un retraso en la programación de solo 3.3%.

3.3.2 Nivel de cumplimiento acumulado por proyectos

Los resultados acumulados del avance de los **veintiún (21) proyectos** del PMIA hasta el período en estudio (31 de mayo 2016), muestran el siguiente nivel de cumplimiento: **once (11) proyectos** mantienen un estado de **avance parcial (APA)**, representando el 52.38% de los

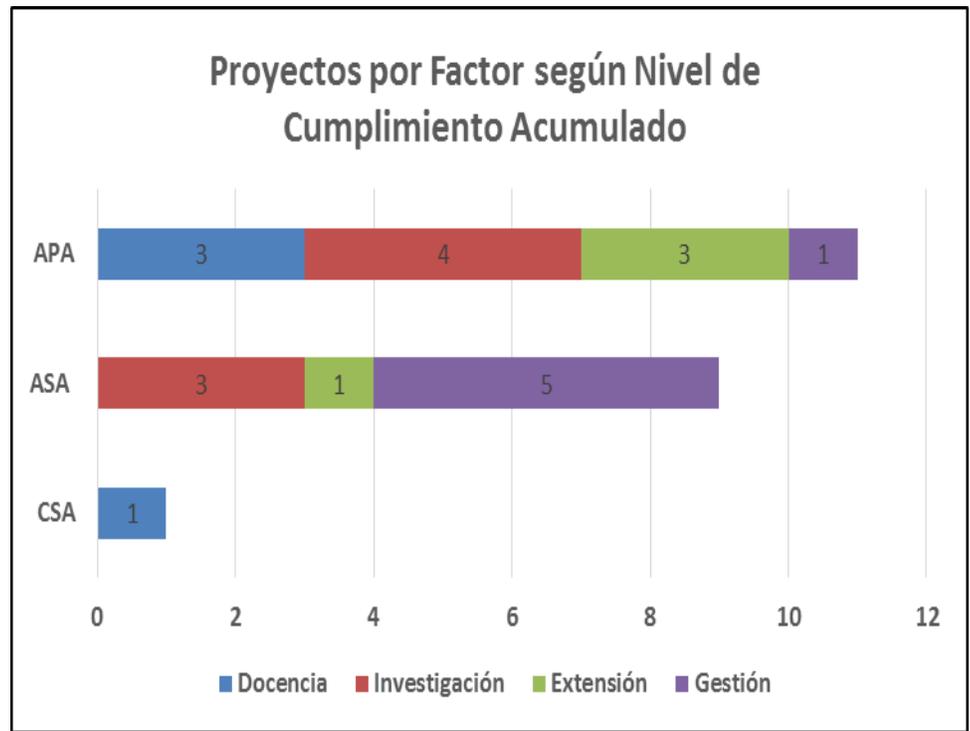

proyectos formulados, indicando que se observó un cumplimiento menor que el programado. **Nueve (9)** proyectos alcanzaron un **avance satisfactorio (ASA)**, de manera que los proyectos tuvieron un cumplimiento en correspondencia con lo programado (42.86%); mientras que **un (1)** proyecto resultó con estado de **conclusión satisfactoria (CSA)**, y culminó de acuerdo con la fecha de finalización (4.76%), este proyecto concluyó en el periodo del 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014 (Segundo Informe de Cumplimiento).

ANEXOS

ANEXO 1.

LISTADO DE EVIDENCIAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

codigo

Factor: Docencia Universitaria

Proyecto: 1 Desarrollo de Estudios de Demanda Laboral en Ingeniería y Tecnología

Indicadores:

Objetivo: Determinar la naturaleza de la demanda y oferta de profesionales en el País

Estudios de demanda de los perfiles profesionales y ocupacionales para el desarrollo del país y que consideran los requerimientos regionales e internacionales

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Desarrollo del Estudio del Campo [2/2]	090.12.03.02.111	Informe del Listado de las Empresas Encuestadas para Estudio de Demanda y Oferta de Profesionales, Técnicos y de Servicios de Extensión, año 2015
	090.12.03.02.150	Modelo de Encuestas Aplicadas para Estudio de Oferta y Demanda de Profesionales, Técnicos y de Servicios de Extensión, año 2015 (Evidencia reposa en DIPLAN)
Procesamiento de la información [2/2]	004.01.04.02.200	Reporte y Gráficos del análisis estadístico para el estudio de Oferta y Demanda de Profesionales, Técnicos y de Servicios de Extensión, año 2015. (Evidencia reposa en DIPLAN)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
 Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

codigo

Factor: Docencia Universitaria

Proyecto: 3 Actualización y perfeccionamiento del personal docente

Indicadores:

Objetivo: Favorecer el desarrollo profesional del docente mediante procesos reflexivos que vinculen teoría y práctica en el nivel universitario

Porcentaje de docentes con formación de la especialidad y en docencia superior con relación al número de docentes que laboran en la universidad, Capacitación y desarrollo docente, Porcentaje de

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Diseño y programación de los cursos de capacitación [9/11]	030.03.02.09.028	Circular VRA-C-057-2015 Restructuración de la Plataforma Virtual - Cursos en Moodle y Jornada de Actualización para Docentes
	030.03.02.09.148	Memorando VRA-M080-2015 Disposiciones para el Receso Académico - Verano 2016
Ofrecimiento de capacitación docente en el aprendizaje y utilización del inglés como segundo idioma (3/3)	030.03.05.03.198	Recibo de pago de Congreso TESOL
	030.03.05.03.003	Afiche
	168.21.02.05.171	Nota RUTP-N-35-010-2016 Informa de los Proyectos de Inversión bajo su coordinación

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
 Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

codigo

Factor: Docencia Universitaria

Proyecto: 3 Actualización y perfeccionamiento del personal docente

Indicadores:

Objetivo: Favorecer el desarrollo profesional del docente mediante procesos reflexivos que vinculen teoría y práctica en el nivel universitario

Porcentaje de docentes con formación de la especialidad y en docencia superior con relación al número de docentes que laboran en la universidad, Capacitación y desarrollo docente, Porcentaje de

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Ofrecimiento de capacitación docente en el aprendizaje y utilización del inglés como segundo idioma (3/3)	030.03.05.03.074	Formulario de donación de Congreso TESOL
	030.03.05.03.075	Foto Congreso TESOL-1
	030.03.05.03.076	Foto Congreso TESOL-2
	030.03.05.03.077	Foto Congreso TESOL-3
	030.03.05.03.022	Cheque para pago de Congreso TESOL
Ofrecimiento de cursos de Docencia Superior Virtual (8/10)	030.03.02.09.028	Circular VRA-C-057-2015 Restructuración de la Plataforma Virtual - Cursos en Moodle y Jornada de Actualización para Docentes
	030.03.02.09.148	Memorando VRA-M080-2015 Disposiciones para el Receso Académico - Verano 2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
 Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

codigo

Factor: Docencia Universitaria

Proyecto: 3 Actualización y perfeccionamiento del personal docente

Indicadores:

Objetivo: Favorecer el desarrollo profesional del docente mediante procesos reflexivos que vinculen teoría y práctica en el nivel universitario

Porcentaje de docentes con formación de la especialidad y en docencia superior con relación al número de docentes que laboran en la universidad, Capacitación y desarrollo docente, Porcentaje de

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Ofrecimiento de cursos de Docencia Superior Virtual (9/10)	030.03.02.09.148	Memorando VRA-M080-2015 Disposiciones para el Receso Académico - Verano 2016
	030.03.03.09.164	Memorando VRA-M-083-2015 Capacitaciones en Receso Académico
	030.03.03.09.138	Listado de Docentes Inscritos y Status de Aprobación del Curso Virtual de Docencia Superior
Ofrecimiento de otros cursos varios de capacitación para docentes en el receso académico (4/4)	030.03.04.04.019	Capacitaciones del Receso Académico 2016 de: FIS-FII-CR AZUERO-CR COCLE-CR PANAMÁ OESTE-CR VERAGUAS
	030.03.04.04.027	Circular VRA-C-054-2015 Actividades de Investigación y Capacitación -Opciones 120 horas durante el Receso Académico Verano 2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
 Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

codigo

Factor: Docencia Universitaria

Proyecto: 3 Actualización y perfeccionamiento del personal docente

Indicadores:

Objetivo: Favorecer el desarrollo profesional del docente mediante procesos reflexivos que vinculen teoría y práctica en el nivel universitario

Porcentaje de docentes con formación de la especialidad y en docencia superior con relación al número de docentes que laboran en la universidad, Capacitación y desarrollo docente, Porcentaje de

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Ofrecimiento de otros cursos varios de capacitación para docentes en el receso académico (4/4)	030.03.02.09.148	Memorando VRA-M080-2015 Disposiciones para el Receso Académico - Verano 2016
	030.03.04.04.029	Circular VRA-C-42-2015 Capacitaciones del Receso Académico 2016
	030.03.04.04.154	Nota CEC-FII-16-01 Inscritos en Capacitaciones del Receso Académico 2016
	030.03.03.09.164	Memorando VRA-M-083-2015 Capacitaciones en Receso Académico
	030.03.04.04.193	Programa de Actividades a Desarrollar por los Docentes Tiempo Completo Receso Académico 2016 de CR Coclé

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

codigo

Factor: Docencia Universitaria

Proyecto: 4 Sistema de Evaluación del desempeño docente y la conectividad con los procesos de selección, capacitación y contratación

Actualizar el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente

Indicadores:

Actualización y seguimiento del desarrollo del personal docente, Evaluación del desempeño docente, Seguimiento a la evaluación del desempeño con orientación para la mejora continúa,

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Actualización y Mantenimiento del Sistema (3/3)	025.04.07.03.175	Nota VRA-N-831-2016 Reiteración de solicitud de información
	025.04.07.03.176	Nota VRA-N-867-2015 Solicitud de información

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Desarrollo de las actividades: ferias, seminarios, talleres, entre otros [12/15]	051.05.03.12.048	Correos de la Dirección de Investigación Divulgando Diversas Actividades del Área de Investigación o de los Investigadores .
	051.05.03.12.080	Fotos de los participantes al 5 Congreso de Ciencia y Tecnología. 2015
	051.05.03.12.081	Fotos de los asistentes a la II Feria Informativa de la DI. 2015
	051.05.03.12.125	Lista de asistencia a la II Feria Informativa.-2015
	051.05.03.12.130	Lista de asistentes al congreso
	051.05.03.12.135	Lista de Participantes al Octavo Ciclo de Conferencia de I+D+i (jueves 27 de agosto de 2015)
	051.05.03.12.158	Nota de Prensa de la II Feria Informativa. - 2015
	051.05.03.12.160	Nota de Prensa del 5 Congreso de Ciencia y Tecnología

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Desarrollo de las actividades: ferias, seminarios, talleres, entre otros [12/15]	051.05.03.12.161	Nota de Prensa e Imágenes al Octavo Ciclo de Conferencias I+D+i (jueves 27 de agosto de 2015)
	051.05.03.12.185	Plataforma del 5 Congreso
	051.05.03.12.190	Programación de Presentación 5 congreso
	051.05.03.12.192	Programa de 8va entrega del Ciclo de Conferencia de I+D+i (jueves 27 de agosto de 2015)
	051.05.03.12.194	Programa del 5 Congreso de Ciencia y Tecnología

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Desarrollo de las actividades: ferias, seminarios, talleres, entre otros [13/15]	051.05.03.13.092	Imágenes de la I Feria Informativa
	051.05.03.13.134	Lista de Participantes a la I Feria Informativa
Organización, consecución y preparación de los recursos necesarios [12/15]	051.05.02.12.005	Afiche del Promoción e Invitación al 5 Congreso.
	051.05.02.12.026	Circular VIPE-DI-003-15 Invitando a la II Feria Informativa de la DI(octubre de 2015)
	051.05.02.12.062	Currículo de los expositores
	051.05.02.12.063	Documentos de formulario de servicios de audiovisual y prensa (grabar eventos, fotos, notas de prensa)(2015)
	051.05.02.12.064	Documentos de solicitud de mobiliario y servicio para actividades (2015)
	051.05.02.12.119	Invitación al Noveno evento del Ciclo de Conferencias de I+D+i (octubre 2015)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Organización, consecución y preparación de los recursos necesarios I12/15I	051.05.02.12.120	Invitación Octavo ciclo de conferencia I+D+i (2015)
	051.05.02.12.226	Solicitud a conferencista a participar en el 8 ciclo de conferencias (2015)
	051.05.02.12.227	Solicitud de salón para realizar actividades de Ciclo de conferencias I+D+i (2015)
Organización, consecución y preparación de los recursos necesarios I13/15I	051.05.02.13.045	Correo invitando al 1 Ciclo de conferencia I+D+i
	051.05.02.13.046	Correo invitando al Taller de Escritura de Artículos Científicos
	051.05.02.13.052	Correos promoviendo las actividades de la DI (Talleres, Feria, JIC, otros)
	051.05.02.13.065	Documentos de solicitud de mobiliarios y servicio para actividades (22 de enero de 2016)
	051.05.02.13.066	Documentos de solicitud de servicios de audiovisuales y prensa (grabar los eventos, tomar fotos, nota de prensa de la actividad)(20 de enero de 2016)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Organización, consecución y preparación de los recursos necesarios [13/15]	051.05.02.13.117	Invitación al 2 ciclo de conferencia I+D+i -2016
	051.05.02.13.118	Invitación al 3 ciclo de conferencia I+D+i - 2016
Organización, consecución y preparación de los recursos necesarios [14/15]	051.05.02.14.024	Circular para la Organización de la Primera Feria Informativa-2016
Planificación anual de actividades [5/5]	051.05.01.05.184	Plan anual de la DI 2016-2018
Seguimiento y evaluación de las actividades (11/15)	051.05.04.11.098	Informe de Ciclos de Conferencias I+D
	051.05.04.11.214	Revista I+D+i.- 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Seguimiento y evaluación de las actividades (12/15)	051.05.04.12.021	Catálogo de Publicaciones. Portada. -2015
	051.05.04.12.051	Correos Invitando a Publicar en Revista I+D+i Vol.II, N.2, 2015
	051.05.04.12.097	Informe de Asistencias a II Feria informativa de la Dirección de Investigación
	051.05.04.12.115	Informes de Ciclos de Conferencias I+D
	051.05.04.12.149	Memoria de la Dirección de Investigación. - 2015
	051.05.04.12.156	Nota de Prensa de Catálogo de Publicaciones.- 2015
	051.05.04.12.197	Publicaciones del Primer Volumen de RIC. - 2015
	051.05.04.12.215	Revista RIC. Correos invitando a publicar. - 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Seguimiento y evaluación de las actividades (12/15)	051.05.04.12.216	Revista RIC. Nota de Prensa.- 2015
Seguimiento y evaluación de las actividades (13/15)	051.05.04.13.096	Informe de Asistencias a Ciclos de conferencias de I+D de 2016 de la Dirección de Investigación
	051.05.04.13.104	Informe de I Feria Informativa DI, 2016
	051.05.04.13.186	Power point del repositorio Institucional de la UTP.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 6 Sistematización de la información relativa al grado de participación de los estudiantes de postgrado en trabajos de investigación

Indicadores:

Objetivo: Contar con un lineamiento que mida el nivel de participación de los estudiantes de los programas de postgrado profesionales y académicos en trabajos de investigación

Participación de los estudiantes de postgrados en trabajos de investigación

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Recepción en Facultades de la información recopilada por parte de los Centros Regionales (3/3)	053.06.06.03.034	Correo 18-04-16, Coclé
	053.06.06.03.036	Correo 3-05-16, Colón
	053.06.06.03.037	Correo 5-04-16, Bocas del Toro
	053.06.06.03.038	Correo 5-04-16, Panamá Oeste
	053.06.06.03.039	Correo 7-04-16, Azuero
	053.06.06.03.168	Nota No. 0842-DR-UTPCh-2016, Chiriquí
	053.06.06.03.170	Nota No. UTC-N-186-2016, Coclé

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 6 Sistematización de la información relativa al grado de participación de los estudiantes de postgrado en trabajos de investigación

Indicadores:

Objetivo: Contar con un lineamiento que mida el nivel de participación de los estudiantes de los programas de postgrado profesionales y académicos en trabajos de investigación

Participación de los estudiantes de postgrados en trabajos de investigación

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Revisión y consolidación de la info. por parte de la DSEP; y generación de reportes relativos al % anual de participación de estudiantes de postgrado en trabajos de investigación (3/3)	053.06.08.03.061	Cuadro Resumen elaborado por la Dirección del Sistema de Estudios de Postgrado
	053.06.08.03.142	Matrícula Total de Postgrado por Sede, Facultad, Programa. (Primer Semestre 2015)
	053.06.08.03.143	Matrícula Total de Postgrado por Sede, Facultad, Programa. (Segundo Semestre 2015)
	053.06.08.03.144	Matrícula Total de Postgrado por Sede, Facultad, Programa. (Verano 2015)
Revisión y consolidación por parte de las Facultades de la información generada tanto en los Centros Regionales como en la Sede; y entrega de la misma a la DSEP (3/3)	053.06.07.03.169	Nota No. FISC-CP-5-16, 12-01-16, Facultad de Sistemas.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 6 Sistematización de la información relativa al grado de participación de los estudiantes de postgrado en trabajos de investigación

Indicadores:

Objetivo: Contar con un lineamiento que mida el nivel de participación de los estudiantes de los programas de postgrado profesionales y académicos en trabajos de investigación

Participación de los estudiantes de postgrados en trabajos de investigación

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Solicitud formal a las unidades académicas para la recopilación anual de la información y la designación de un personal de enlace (4/4)	053.06.05.04.033	Correo 1-04-16, dirigido a Decano, Vicedecanos, Coordinadores de Postgrado y Asistentes a la Coordinación de Postgrado , Centros Regionales.
	053.06.05.04.035	Correo 20-04-16, dirigido a Vicedecanos de Investigación , Coordinadores de Postgrado y Asistentes a la Coordinación de Postgrado .
	053.06.05.04.141	Llamadas telefónicas a Vicedecanos de Investigación , Coordinadores de Postgrado y Coordinación de Postgrado de Veraguas .
	053.06.05.04.146	MEMO No. VIPE-DP-060-2016, 30-03-16
	053.06.05.04.147	MEMO No. VIPE-T-016-2015, 12-11-15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 7 Fortalecimiento de los grupos de investigación y de estudio

Indicadores:

Objetivo: Dotar a la universidad con recursos humanos de calidad para la conformación de grupos de investigación de acuerdo a las políticas nacionales de desarrollo del país y atendiendo las tendencias globales

Lineamientos para la organización de grupos, líneas y proyectos de investigación

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Convocatoria para el fortalecimiento a los grupos de investigación y de estudio [3/3]	058.07.03.03.053	Cuadro con grupos de investigación creados en 2016
	058.07.02.03.004	Afiche de Promoción de la JIC - 2016
	058.07.02.03.018	Brochure para promocionar la JIC -2016
	058.07.02.03.040	Correo con invitación a Jornada de Iniciación Científica2016
	058.07.02.03.067	Entrega de notas de invitación para la Jornada de Iniciación Científica Nacional. Formulario con la firma de recibido de las instituciones visitadas.
	058.07.02.03.079	Foto: Personal de la UTP, trabajando la Jornada de Iniciación Científica en la UDI- 2016
	058.07.02.03.085	Grupos de Investigación Registrados en la Dirección de Investigación. - 2016
	058.07.02.03.091	Imágenes de Jornada Científica. Centro Regional de Veraguas
	058.07.02.03.094	Imágenes del taller jornada JIC 16-18-marzo 2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 7 Fortalecimiento de los grupos de investigación y de estudio

Indicadores:

Objetivo: Dotar a la universidad con recursos humanos de calidad para la conformación de grupos de investigación de acuerdo a las políticas nacionales de desarrollo del país y atendiendo las tendencias globales

Lineamientos para la organización de grupos, líneas y proyectos de investigación

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Convocatoria para el fortalecimiento a los grupos de investigación y de estudio I3/31	058.07.02.03.122	JIC. actividades con integrantes de otras Universidades
	058.07.02.03.124	Link de la página de la Jornada de Iniciación Científica http://iniciacioncientifica.utp.ac.pa
	058.07.02.03.126	Lista de asistencia a la jornada de la JIC del 15-19 de febrero de 2016(Centros Regionales de Coclé, Azuero y Veraguas)
	058.07.02.03.127	Lista de asistencia a Taller de Capacitación Científica . Participan otras Universidades
	058.07.02.03.129	Lista de asistencia de participantes de la jornada JIC (Aquí participan docentes de diferentes Universidades que ofertan carrera de Ciencias y Tecnología)La JIC será financiada por la SENACYT, por 5
	058.07.02.03.131	Lista de equipo que participa en la Organización de la JIC. -2016
	058.07.02.03.136	Listado de Asistencia a Jornada de Iniciación Científica Bocas del Toro - 2016
	058.07.02.03.157	Nota de Prensa de Evento del 29 de Febrero de 2016 de la JIC.
	058.07.02.03.159	Nota de Prensa de la jornada JIC 15-19 de febrero (Centros Regionales. Azuero, Coclé y Veraguas) 2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 7 Fortalecimiento de los grupos de investigación y de estudio

Indicadores:

Objetivo: Dotar a la universidad con recursos humanos de calidad para la conformación de grupos de investigación de acuerdo a las políticas nacionales de desarrollo del país y atendiendo las tendencias globales

Lineamientos para la organización de grupos, líneas y proyectos de investigación

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Negociación y adjudicación de las propuestas avaladas [2/3]	058.07.03.02.012	Artículos de la Jornada JIC, publicados en la Revista de Iniciación Científica
	058.07.03.02.084	Fotos-Jic 2015
	058.07.03.02.095	Imágenes JIC Chiriquí- 2015
	058.07.03.02.106	Informe de la jornada JIC 2015 (informe, grupos participantes del evento, grupo ganador que representó a la UTP en el exterior , nota de prensa)
	058.07.03.02.116	Invitación del Grupo de investigación en Ingeniería y Ciencias ambientales de la FIC, invita a cierre de proyecto.
	058.07.03.02.121	JIC Informe de Participación de las Facultades
	058.07.03.02.123	Jornada JIC-Chiriquí Nota de Prensa- 2015
	058.07.03.02.163	Nota de Prensa JIc-2015
Negociación y adjudicación de las propuestas avaladas [3/3]	058.07.03.03.053	Cuadro con grupos de investigación creados en 2016
	058.07.03.03.082	Fotos: Diferentes universidades estatales y privadas que participan en la JIC.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 8 Desarrollo e implementación de un Sistema de información de convenios y acuerdos nacionales e internacionales

Indicadores:

Objetivo: Realizar un inventario de los convenios nacionales e internacionales para que se use de referencia para las diferentes actividades que realiza la institución en términos académicos, de investigación, extensión y vinculación

Convenios o alianzas estratégicas para el fomento y desarrollo de investigaciones nacionales e internacionales

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Actualización y Mantenimiento del Sistema (4/6)	059.08.06.04.234	Sitio Web de Convenios Internacionales de la UTP : http://www.utp.ac.pa/listado-de-convenios-internacionales
	059.08.06.04.235	Sitio web de Convenios de la UTP con Empresas , Instituciones y ONG: http://www.utp.ac.pa/institucion
Actualización y Mantenimiento del Sistema (5/6)	059.08.06.05.042	Correo electrónico entre DITIC y Dirección de Extensión sobre las adecuaciones a la aplicación de Convenios Nacionales
	059.08.06.05.044	Correo invitación a capacitación del Sitio de Convenios UTP
	059.08.06.05.089	http://www.utp.ac.pa/ministerio-de-relaciones-exteriores

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 9 Reconocimiento para investigadores de la UTP a través del Programa de Incentivos, Estímulos y Premiación a la Investigación

Indicadores:

Objetivo: Aumentar el número de proyectos I+D+i por áreas de investigación definidas de acuerdo a los sectores prioritarios del país.

Convenios o alianzas estratégicas para el fomento y desarrollo de investigaciones nacionales e internacionales

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Adjudicación de los incentivos, estímulos y premios [3/3]	059.09.02.03.054	Cuadro de descarga horaria para docentes que hacen investigación 2016
Convocatoria del Programa de Incentivos, Estímulos y Premiación a la Investigación [3/3]	059.09.02.03.054	Cuadro de descarga horaria para docentes que hacen investigación 2016
	059.09.02.03.011	Anuncios enviados por correos de las oportunidades de Cospivot 2015
	059.09.02.03.054	Cuadro de descarga horaria para docentes que hacen investigación 2016
	059.09.02.03.083	Fotos: Premio al investigador destacado y a los mejores tesis -2015
	059.09.02.03.155	Nota de Prensa - 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad

Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COI

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 10 Adquisición de Software con Licencias para la UTP

Indicadores:

Objetivo: Adquirir software con licenciamiento para brindar el usuario final (administrativo, docente, estudiante o investigador) una herramienta que satisfaga las necesidades dependiendo de las funciones que realicen

Mantenimiento periódico de las TIC's

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Formulación de los requerimientos para adquisición de software a ser incorporados en el presupuesto UTP del año siguiente [5/5]	075.10.02.05.025	Circular VIAD-C-06-16
	075.10.02.05.145	Memo DIPLAN-DP-M-001-16
	075.10.02.05.172	Nota RUTP-N-35-015-2016
Instalación o actualización de los software adquiridos con anterioridad a nivel nacional (11/15)	075.10.04.11.099	Informe de Consumo de Licencias agosto_2015
Instalación o actualización de los software adquiridos con anterioridad a nivel nacional (12/15)	075.10.04.12.100	Informe de Consumo de Licencias enero_febrero_2016
Instalación o actualización de los software adquiridos con anterioridad a nivel nacional (13/15)	075.10.04.13.101	Informe de Consumo de Licencias Mayo2016
Realización de los trámites requeridos para la adquisición de los softwares [4/5]	075.10.03.04.217	SBSE 12015-1992 Antivirus PC
	075.10.03.04.218	SBSE 12015-2454 Antivirus servidores
	075.10.03.04.219	SBSE 12015-2460 Microsoft

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad

AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COI

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 10 Adquisición de Software con Licencias para la UTP

Indicadores:

Objetivo: Adquirir software con licenciamiento para brindar el usuario final (administrativo, docente, estudiante o investigador) una herramienta que satisfaga las necesidades dependiendo de las funciones que realicen

Mantenimiento periódico de las TIC's

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Realización de los trámites requeridos para la adquisición de los softwares [5/5]	075.10.03.05.220	SBSE 12016-1306 Microsoft
	075.10.03.05.221	SBSE12016-1208 Antivirus PC
	075.10.03.05.222	SBSE12016-1213 Antivirus Servidores
Seguimiento de las instalaciones o actualizaciones de software realizadas anteriormente (11/14)	075.10.05.11.013	Aviso del 25 septiembre 2015 sobre actualización de servidores
Seguimiento de las instalaciones o actualizaciones de software realizadas anteriormente (12/14)	075.10.05.12.030	Circular/DITIC/C/01/16
Seguimiento de las instalaciones o actualizaciones de software realizadas anteriormente (13/14)	075.10.05.13.023	Circular DITIC/04/16
	075.10.05.13.166	Nota DITIC/086/16
	075.10.05.13.167	Nota DITIC/287/14
	075.10.05.13.232	Nota del Centro Regional Coclé sobre actualización del windows

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

codigo

Factor: Investigación e Innovación

Proyecto: 11 Programa Institucional para el fortalecimiento de las actividades de investigación e innovación

Indicadores:

Objetivo: Promover y fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Recursos económicos asignados a investigación en el presupuesto institucional que corresponden a la planificación y ejecución de las actividades de investigación e innovación

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Selección de propuestas avaladas por el Comité de Recepción (4/4)	079.11.06.04.059	Cuadro de propuestas avaladas por SENACYT
	079.11.06.04.132	Lista de la Oficina de Apoyo al investigador , (asesoría a profesores, investigadores y estudiantes) para la presentación de propuestas y la búsqueda de fondos
Apertura y Recepción de Propuestas [4/4]	079.11.04.04.102	Informe de Ejecución Presupuestaria . Diciembre 2015
Evaluación por Comité de Evaluación de pares externos (4/4)	079.11.05.04.057	Cuadro de Presupuesto de Inversiones para Proyecto al 30 de marzo de 2016
Negociación y adjudicación de las propuestas avaladas (4/5)	079.11.07.04.058	Cuadro de Presupuesto de Inversiones por Proyecto al 30 de junio de 2015.(Tomado del Informe de Ejecución Presupuestaria junio 2015)
Negociación y adjudicación de las propuestas avaladas (5/5)	079.11.06.04.132	Lista de la Oficina de Apoyo al investigador , (asesoría a profesores, investigadores y estudiantes) para la presentación de propuestas y la búsqueda de fondos
	079.11.03.05.032	Convenio con SENACYT (Reposa en Dirección de Investigación)
	079.11.07.05.060	Cuadro N.8. Presupuesto de Inversiones por Proyectos.
Organización del Programa [5/5]	059.09.02.03.054	Cuadro de descarga horaria para docentes que hacen investigación 2016
	079.11.03.05.032	Convenio con SENACYT (Reposa en Dirección de Investigación)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

codigo

Factor: Extensión Universitaria

Proyecto: 12 Desarrollo de Estudios de Necesidades de Extensión y Servicio a la Sociedad

Indicadores:

Objetivo: Determinar las necesidades que tiene la sociedad, a través de sus sectores productivos

Estudios de las necesidades de extensión y servicios, para la sociedad

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Desarrollo del Estudio del Campo [2/2]	090.12.03.02.109	Informe del Listado de las Empresas Encuestadas para Estudio de Demanda y Oferta de Profesionales, Técnicos y de Servicios de Extensión, año 2015.
Procesamiento de la información [2/2]	004.01.04.02.200	Reporte y Gráficos del análisis estadístico para el estudio de Oferta y Demanda de Profesionales, Técnicos y de Servicios de Extensión, año 2015. (Evidencia reposa en DIPLAN)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

codigo

Factor: Extensión Universitaria

Proyecto: 13 Implementar un Sistema de Información en el marco de la internacionalización

Indicadores:

Objetivo: Fortalecer la internacionalización mediante la apropiación e involucramiento de todos los estamentos, para el logro de una mayor participación en los distintos programas internacionales e interculturales

Intercambio y movilidad de docentes, estudiantes y personal administrativo a nivel internacional

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Actualización de la Página "UTP Sin Fronteras" en Facebook y TWITTER	104.13.05.00.009	Anuncio Red Social Facebook "UTP Internacional", Dirección de Relaciones Internacionales
	104.13.05.00.010	Anuncio Red Social Twitter "UTP Internacional", Dirección de Relaciones Internacionales
Publicación continua de las oportunidades de programas internacionales a nivel nacional (8/10)	104.13.02.08.016	Boletín Informativo N°4, N°5 y N°6 (Correo masivo a la Comunidad UTP)
	104.13.02.08.196	Publicación a través de la Pag Web UTP de la Firma de Convenios UTP-HUAWEI "Programa de Semilla para el Futuro" y UTP-UTSEM México
	104.13.02.08.006	Afiche Feria de Becas y Oportunidades Internacionales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

codigo

Factor: Extensión Universitaria

Proyecto: 13 Implementar un Sistema de Información en el marco de la internacionalización

Indicadores:

Objetivo: Fortalecer la internacionalización mediante la apropiación e involucramiento de todos los estamentos, para el logro de una mayor participación en los distintos programas internacionales e interculturales

Intercambio y movilidad de docentes, estudiantes y personal administrativo a nivel internacional

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Publicación continua de las oportunidades de programas internacionales a nivel nacional (9/10)	104.13.02.09.020	Catálogo de Capacidades por área temática, especialidades y grupos de investigación
	104.13.02.09.231	Volantes Study Abroad in Panama
	104.13.02.09.007	Afiche Segunda Feria de Becas y Oportunidades Internacionales
	104.13.02.09.017	Boletín informativo N°7 y N°8 (Correo masivo a la Comunidad UTP)
Sesiones Presenciales de información, comunicación y orientación sobre los Programas Internacionales (5/7)	104.13.01.05.014	Bienvenida a estudiantes de intercambio Julio 2015
	104.13.01.05.069	Feria de Becas y Oportunidades Internacionales
	104.13.01.05.179	Pasantía estudiantes de Francia 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

codigo

Factor: Extensión Universitaria

Proyecto: 13 Implementar un Sistema de Información en el marco de la internacionalización

Indicadores:

Objetivo: Fortalecer la internacionalización mediante la apropiación e involucramiento de todos los estamentos, para el logro de una mayor participación en los distintos programas internacionales e interculturales

Intercambio y movilidad de docentes, estudiantes y personal administrativo a nivel internacional

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Sesiones Presenciales de información, comunicación y orientación sobre los Programas Internacionales (5/7)	104.13.01.05.224	Sesiones Informativas realizadas durante los meses junio, julio, agosto y septiembre 2015
	104.13.01.05.229	Visitas de estudiantes internacionales a la UTP jun, jul, sep 2015
Sesiones Presenciales de información, comunicación y orientación sobre los Programas Internacionales (6/7)	104.13.01.06.015	Bienvenida Intercambio del Primer Semestre del 2016
	104.13.01.06.223	Segunda Feria de Becas y Oportunidades Internacionales
	104.13.01.06.225	Sesiones informativas realizadas los meses de febrero, marzo y abril 2016
	104.13.01.06.228	Stand Informativo Seminario de Inducción Universitaria
	104.13.01.06.128	Lista de Asistencia Bienvenida a Estudiantes Internacionales I Semestre
	104.13.01.06.139	Listas de Asistencia a Sesiones Informativas Febrero, Marzo y Abril 2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

codigo

Factor: Extensión Universitaria

Proyecto: 14 Desarrollo e implementación de un Sistema web de Gestión de Egresados y Graduados UTP

Indicadores:

Objetivo: Lograr contactos y canales de comunicación vinculando a los egresados y graduados de la UTP, mediante el desarrollo de un red social de participantes

Contacto y canales de comunicación establecidos con los graduados

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Actualización y Mantenimiento del Sistema (2/5)	111.14.05.02.087	http://alumni.utp.ac.pa/blog/
	111.14.05.02.233	www.utp.ac.pa/sitio-de-intercambio-social-de-graduados
Actualización y Mantenimiento del Sistema (3/5)	111.14.05.03.001	Acuerdo de la Reunión del 30/09/15 con DIPLAN
	111.14.05.03.049	Correos electrónicos 2015
	111.14.05.03.078	Foto de reunión sostenida entre VRA, CRA y Dirección de Extensión el 25/09/2015, acerca del Sistema de Seguimiento a Egresados
	111.14.05.03.086	http://alumni.utp.ac.pa/becas-senacyt/
	111.14.05.03.180	PDF de la propuesta del SISAE
Actualización y Mantenimiento del Sistema (4/5)	111.14.05.04.050	Correos electrónicos 2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

codigo

Factor: Extensión Universitaria

Proyecto: 14 Desarrollo e implementación de un Sistema web de Gestión de Egresados y Graduados UTP

Indicadores:

Objetivo: Lograr contactos y canales de comunicación vinculando a los egresados y graduados de la UTP, mediante el desarrollo de un red social de participantes

Contacto y canales de comunicación establecidos con los graduados

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Actualización y Mantenimiento del Sistema (4/5)	111.14.05.04.174	Nota VRA-N-449-2016. Invitación a Reunión de Seguimiento a Egresados
Monitoreo periódico al sistema para el seguimiento y mejoramiento de los servicios a partir de las sugerencias de los graduados (1/4)	111.14.06.01.093	Imágenes del cuestionario.
Monitoreo periódico al sistema para el seguimiento y mejoramiento de los servicios a partir de las sugerencias de los graduados (2/4)	111.14.05.03.180	PDF de la propuesta del SISAE
	111.14.06.02.088	http://andromeda.ls.utp.ac.pa/egresadosutp/ Aplicación del CRA, la cual se adecuará a nuestras necesidades

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

codigo

Factor: Extensión Universitaria

Proyecto: 14 Desarrollo e implementación de un Sistema web de Gestión de Egresados y Graduados UTP

Indicadores:

Objetivo: Lograr contactos y canales de comunicación vinculando a los egresados y graduados de la UTP, mediante el desarrollo de un red social de participantes

Contacto y canales de comunicación establecidos con los graduados

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Monitoreo periódico al sistema para el seguimiento y mejoramiento de los servicios a partir de las sugerencias de los graduados (2/4)	111.14.06.02.173	Nota VIPE-DE-119-2015, del 29 de septiembre de 2015
	111.14.05.03.001	Acuerdo de la Reunión del 30/09/15 con DIPLAN
	111.14.05.03.078	Foto de reunión sostenida entre VRA, CRA y Dirección de Extensión el 25/09/2015, acerca del Sistema de Seguimiento a Egresados
Monitoreo periódico al sistema para el seguimiento y mejoramiento de los servicios a partir de las sugerencias de los graduados (3/4)	111.14.06.03.137	Listado de Asistencia a reunión de Seguimiento a Egresados , del 10 de mayo de 2016
	111.14.05.04.174	Nota VRA-N-449-2016. Invitación a Reunión de Seguimiento a Egresados
	111.14.06.03.002	Acuerdo de Reunión del 10 de mayo de 2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

codigo

Factor: Extensión Universitaria

Proyecto: 15 Reactivación de Asociación de Egresados de la UTP (ASETEC) y su vinculación con los egresados y graduados

Indicadores:

Objetivo: Reactivar las actividades de vinculación de la ASETEC con nuestra Institución, tales como participación en el fortalecimiento de planes y programas de estudios, evaluación y desarrollo de nuevas actividades que se conjuguen en

Agrupaciones formalmente constituidas de los graduados

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Convocatoria a reunión de Invitación a los graduados para formar parte de la Junta de Elecciones de ASETEC (2/2)	116.15.06.01.041	Correo electrónico del 29-07-2015, se solicita a la anterior presidenta de la Junta Directiva de la ASETEC firme documento para la inscripción de la ASETEC en el Registro Público
Convocatoria, Calendario y Elecciones de la Junta Directiva (2/2)	116.15.06.01.041	Correo electrónico del 29-07-2015, se solicita a la anterior presidenta de la Junta Directiva de la ASETEC firme documento para la inscripción de la ASETEC en el Registro Público
Notariado y vinculación de la nueva Junta Directiva con la UTP (2/2)	116.15.06.01.041	Correo electrónico del 29-07-2015, se solicita a la anterior presidenta de la Junta Directiva de la ASETEC firme documento para la inscripción de la ASETEC en el Registro Público
Toma de Posesión de la nueva Junta Directiva por la Junta de Elecciones (2/2)	116.15.06.01.041	Correo electrónico del 29-07-2015, se solicita a la anterior presidenta de la Junta Directiva de la ASETEC firme documento para la inscripción de la ASETEC en el Registro Público
Vinculación de la ASETEC con la plataforma de Egresados ALUMNI-UTP	116.15.06.01.041	Correo electrónico del 29-07-2015, se solicita a la anterior presidenta de la Junta Directiva de la ASETEC firme documento para la inscripción de la ASETEC en el Registro Público
	111.14.05.03.078	Foto de reunión sostenida entre VRA, CRA y Dirección de Extensión el 25/09/2015, acerca del Sistema de Seguimiento a Egresados
	111.14.05.04.174	Nota VRA-N-449-2016. Invitación a Reunión de Seguimiento a Egresados
Vinculación de la ASETEC con la plataforma de Egresados ALUMNI-UTP	111.14.05.03.180	PDF de la propuesta del SISAE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

codigo

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 16 Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017

Indicadores:

Objetivo: Definir el marco orientador y programa de trabajo para el período 2013-2017 que contemple los programas y proyectos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos por la UTP

Políticas que promueven y regulan el desarrollo de la gestión, Plan de Desarrollo Institucional

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Institucional (3/3)	123.16.08.03.108	Informe de Seguimiento y Avances del Plan de Desarrollo Institucional para el año 2015

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

codigo

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 17 Desarrollo e implementación de un Sistema Web de Registro y Seguimiento a la Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Facilitar la gestión y toma de decisiones relacionadas con los procesos de Capacitación y Desarrollo, en cuanto a la formación y mejoramiento continuo del recurso humano que labora en la UTP.

Seguimiento a la capacitación y desarrollo del recurso humano

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Actualización y Mantenimiento del Sistema (1/4)	144.17.07.01.152	Modelo de Reportes Ajustados Finales del Aplicativo Web : Reporte de Capacitación de Colaboradores (Sin capacitación)
Actualización y Mantenimiento del Sistema (2/4)	144.17.07.01.152	Modelo de Reportes Ajustados Finales del Aplicativo Web : Reporte de Capacitación de Colaboradores (Sin capacitación)
Jornadas de capacitación en el uso del Sistema	144.17.05.00.140	Listas de Asistencia de Usuarios Potenciales de fecha 26 y 28/04/2016
	144.17.05.00.151	Modelo de Nota de Invitación a Usuarios Potenciales y Equipo Técnico de DITIC
	144.17.05.00.187	PPT de Fotos de Jornada de Capacitación 26 y 28/04/2016
	144.17.05.00.189	PPT de Presentación de Aplicativo Web a Usuarios Potenciales
Presentación y aprobación del Sistema por parte de las Autoridades Universitarias	144.17.04.00.178	Notificación al Rector sobre la convocatoria para la Presentación del Aplicativo Web a Usuarios Potenciales
	144.17.04.00.188	PPT de Presentación de Aplicativo ante Autoridades de la DGRH

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

codigo

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 17 Desarrollo e implementación de un Sistema Web de Registro y Seguimiento a la Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Facilitar la gestión y toma de decisiones relacionadas con los procesos de Capacitación y Desarrollo, en cuanto a la formación y mejoramiento continuo del recurso humano que labora en la UTP.

Seguimiento a la capacitación y desarrollo del recurso humano

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Puesta en marcha del Sistema	144.17.06.00.153	Modelo de reportes: Reporte de Certificación de Educación Continua, Reporte de Perfil Académico Completo
	144.17.06.00.230	Vista de Pantalla del Aplicativo con el listado de todos los reportes en funcionamiento
Validación del Sistema	144.17.03.00.031	Comunicaciones: Solicitud de SHDITIC, Correos, Vista de Pantallas y modelo de reporte finalizado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

codigo

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 18 Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura

Indicadores:

Objetivo: Orientar las políticas de acción para la promoción, desarrollo y reordenación de la infraestructura de los servicios que brinda la Universidad Tecnológica de Panamá; con el fin de priorizar los recursos para la inversión y la operación

Políticas institucionales que regulan la utilización de la planta física y su relación con las necesidades de la institución

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (10/16)	152.18.05.10.112	Informe: "Proyectos Internos en Ejecución, Coordinado por la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura ", Período comprendido desde el 1 de junio de 2015 al 30 de abril de 2016.
Ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (11/16)	152.18.05.10.112	Informe: "Proyectos Internos en Ejecución, Coordinado por la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura ", Período comprendido desde el 1 de junio de 2015 al 30 de abril de 2016.
Ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (12/16)	152.18.05.10.112	Informe: "Proyectos Internos en Ejecución, Coordinado por la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura ", Período comprendido desde el 1 de junio de 2015 al 30 de abril de 2016.
Ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (13/16)	152.18.05.10.112	Informe: "Proyectos Internos en Ejecución, Coordinado por la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura ", Período comprendido desde el 1 de junio de 2015 al 30 de abril de 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

codigo

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 19 Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje complementándolos con prácticas de laboratorios actualizadas y orientadas a capacitar a nuestros estudiantes en las tecnologías de punta que encontrarán en su medio de trabajo

Porcentaje de satisfacción con la disponibilidad de equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Actualización del documento de Proyecto de acuerdo a las necesidades, para el Anteproyecto de Presupuesto de Inversión de la Institución [5/5]	162.19.01.05.181	Perfil de Proyecto: Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá 2014
	162.19.01.05.182	Perfil de Proyecto: Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá 2015
Ejecución y seguimiento del Proyecto (4/5)	079.11.04.04.102	Informe de Ejecución Presupuestaria . Diciembre 2015
Ejecución y seguimiento del Proyecto (5/5)	162.19.05.05.103	Informe de Ejecución Presupuestaria Mayo 2016
Establecimiento de prioridades para asignación de fondos de la vigencia para la ejecución del año en curso (5/5)	162.19.03.05.113	Informe: Decisiones de Proyectos de Inversión 2015
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de los equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios (4/5)	162.19.04.04.114	Informe: Desarrollo de Actividades Comprendidas en los Proyectos del Plan de Mejoramiento Institucional Año 2015 (Requisiciones reposan en las oficinas de la DNPC)
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de los equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios (5/5)	162.19.04.05.105	Informe de Inversión Año 2016 (Requisiciones y Actos Públicos)(Requisiciones reposan en las oficinas de la DNPC)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

codigo

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 19 Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje complementándolos con prácticas de laboratorios actualizadas y orientadas a capacitar a nuestros estudiantes en las tecnologías de punta que encontrarán en su medio de trabajo

Porcentaje de satisfacción con la disponibilidad de equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Incorporación del Proyecto en el Anteproyecto de Presupuesto de la Institución para la siguiente vigencia fiscal [5/5]	162.19.02.05.072	Ficha de Proyecto: Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá 2015
	162.19.02.05.073	Ficha de Proyecto: Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá 2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

codigo

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 20 Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Laboratorios y Talleres a nivel nacional

Indicadores:

Objetivo: Mantener un constante proceso de mantenimiento a los talleres y laboratorios de la Universidad a nivel nacional

Mantenimiento de laboratorios y talleres con la debida renovación y adecuación

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Asignación de tareas para la ejecución de la obra (5/5)	164.20.04.05.177	Notas Informativas a las Unidades sobre la asignación de recursos para la ejecución de Proyectos a través del Presupuesto de Inversiones del año 2016.
Ejecución y seguimiento de las distintas obras del proyecto (4/5)	164.20.05.04.055	Cuadro de Ejecución Presupuestaria de Funcionamiento a nivel de objeto de gasto al 30 de diciembre 2015
Ejecución y seguimiento de las distintas obras del proyecto (5/5)	164.20.05.05.056	Cuadro de Ejecución Presupuestaria de Funcionamiento al 30 de Abril de 2016
Incorporación de necesidades de reparación y mantenimiento en el Presupuesto Institucional de la vigencia del año siguiente [5/5]	162.19.01.05.181	Perfil de Proyecto: Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá 2014
	164.20.02.05.008	Anteproyecto de Presupuesto 2016 (Funcionamiento y Gestión Institucional)
	164.20.02.05.070	Ficha de Proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas del Proyecto Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá
Priorización de intervenciones y costos asociados (5/5)	164.20.03.05.199	Reporte pormenorizado del presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2016 (Cuenta 180 - Presupuesto de Funcionamiento)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

codigo

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 21 Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Indicadores:

Fortalecer la disponibilidad de Bases de Datos Bibliográficas y colecciones para uso de docentes e investigadores

Base de datos y redes especializadas relacionadas con los programas que ofrece la institución

Objetivo:

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Actualización del documento de Proyecto de acuerdo a las necesidades, para el Anteproyecto de Presupuesto de Inversión de la Institución [5/5]	168.21.01.05.165	Nota DIPLAN-DPPD-N-105-16 Respuesta a solicitud de información
	168.21.01.05.183	Perfil del Proyecto: Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá 2014
Ejecución y seguimiento al Proyecto [4/5]	079.11.04.04.102	Informe de Ejecución Presupuestaria . Diciembre 2015
Ejecución y seguimiento al Proyecto [5/5]	162.19.05.05.103	Informe de Ejecución Presupuestaria Mayo 2016
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de las Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales [4/5]	168.21.03.04.201	REQUISICIÓN SBSE12015-1969
	168.21.03.04.205	REQUISICIÓN SBSE12015-1975
	168.21.03.04.206	REQUISICIÓN SBSE12015-2668
	168.21.03.04.202	REQUISICIÓN SBSE12015-1970
	168.21.03.04.203	REQUISICIÓN SBSE12015-1971

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

codigo

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 21 Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Indicadores:

Fortalecer la disponibilidad de Bases de Datos Bibliográficas y colecciones para uso de docentes e investigadores

Base de datos y redes especializadas relacionadas con los programas que ofrece la institución

Objetivo:

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de las Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales I4/51	168.21.03.04.204	REQUISICIÓN SBSE12015-1972
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de las Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales I5/51	168.21.03.05.211	REQUISICIÓN SBSE12016-984
	168.21.03.05.207	REQUISICIÓN SBSE12016-890
	168.21.03.05.208	REQUISICIÓN SBSE12016-975
	168.21.03.05.209	REQUISICIÓN SBSE12016-979
	168.21.03.05.210	REQUISICIÓN SBSE12016-983

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Evidencias por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

codigo

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Proyecto: 21 Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Indicadores:

Objetivo: Fortalecer la disponibilidad de Bases de Datos Bibliográficas y colecciones para uso de docentes e investigadores

Base de datos y redes especializadas relacionadas con los programas que ofrece la institución

Actividad	Codigo deEvidencia	Listado de Evidencias
Incorporación del proyecto en el Anteproyecto de Presupuesto de la Institución para la siguiente vigencia fiscal [5/5]	168.21.02.05.071	Ficha de Proyecto: Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá 2015
	168.21.01.05.165	Nota DIPLAN-DPPD-N-105-16 Respuesta a solicitud de información

ANEXO 2.

**CUADROS DE RESUMEN DE
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
DEL PMIA**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Resumen del Avance de las Actividades Según Factor - Consolidado (Período Anterior y Actual)
AL 31 de mayo 2016

Descripción del Factor	Cantidad de Actividades Consolidadas por Factor	Cantidad de Actividades Concluidas	Cantidad de Actividades Con Avance Sobresaliente (ASO)	Cantidad de Actividades Con Avance Satisfactorio (ASA)	Cantidad de Actividades Con Avance Parcial (APA)	Cantidad de Actividades Sin Registro de Avance (SAV)
1 Docencia Universitaria	15	5	0	0	3	7
2 Investigación e Innovación	37	25	0	2	10	0
3 Extensión Universitaria	20	9	0	1	5	5
4 Gestión Institucional Universitaria	29	23	0	5	1	0
TOTAL	101	62	0	8	19	12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Resumen del Avance de las Actividades Según Factor del Período
Del 1º de junio 2015 al 31 de mayo 2016

Descripción del Factor	Cantidad de Actividades del Período	Cantidad de Actividades Concluidas (CSA)	Cantidad de Actividades Con Avance Sobresaliente (ASO)	Cantidad de Actividades Con Avance Satisfactorio (ASA)	Cantidad de Actividades Con Avance Parcial (APA)	Cantidad de Actividades Sin Registro de Avance (SAV)
1 Docencia Universitaria	13	3	0	0	3	7
2 Investigación e Innovación	37	25	0	2	10	0
3 Extensión Universitaria	18	7	0	1	5	5
4 Gestión Institucional Universitaria	26	20	0	5	1	0
TOTAL	94	55	0	8	19	12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Resumen del Avance de las Actividades Según Factor - De Período Anterior
AL 31 de mayo 2016

Descripción del Factor	Cantidad de Actividades de Período Anterior	Cantidad de Actividades con Conclusión Tardía (CTA)	Cantidad de Actividades con Avance Sobresaliente (ASO)	Cantidad de Actividades con Avance Satisfactorio (ASA)	Cantidad de Actividades con Avance Parcial (APA)	Cantidad de Actividades Sin Registro de Avance (SAV)
1 Docencia Universitaria	2	2	0	0	0	0
3 Extensión Universitaria	2	2	0	0	0	0
4 Gestión Institucional Universitaria	3	3	0	0	0	0
TOTAL	7	7	0	0	0	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Resumen del Avance de las Actividades Según Factor - Sujetas a conclusión
AL 31 de mayo 2016

Descripción del Factor	Cantidad de Actividades de Período Anterior	Cantidad de Actividades con Conclusión Satisfactoria	Cantidad de Actividades con Conclusión Tardía	Cantidad de Actividades Con Avance Sobresaliente (ASO)	Cantidad de Actividades Con Avance Satisfactorio (ASA)	Cantidad de Actividades Con Avance Parcial (APA)	Cantidad de Actividades Sin Registro de Avance (SAV)
1 Docencia Universitaria	14	3	2	0	0	3	6
2 Investigación e Innovación	33	25	0	0	0	8	0
3 Extensión Universitaria	17	7	2	0	0	4	4
4 Gestión Institucional Universitaria	24	20	3	0	0	1	0
TOTAL	88	55	7	0	0	16	10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Resumen del Avance de los Proyectos Según Factor

AL 31 de mayo 2016

Descripción del Factor	Cantidad de Proyectos por Factor	Cantidad de Proyectos Concluidos (CSA)	Cantidad de Proyectos Con Avance Sobresaliente (ASO)	Cantidad de Proyectos Con Avance Satisfactorio (ASA)	Cantidad de Proyectos Con Avance Parcial (APA)	Cantidad de Proyectos Sin Registro de Avance (SAV)
1 Docencia Universitaria	4	1	0	0	3	0
2 Investigación e Innovación	7	0	0	3	4	0
3 Extensión Universitaria	4	0	0	1	3	0
4 Gestión Institucional Universitaria	6	0	0	5	1	0
TOTAL	21	1	0	9	11	0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

AVANCE PROMEDIO DEL FACTOR

AL 31 de mayo 2016

Código del Factor	Descripción del Factor	% de Avance del Factor		Estado del Factor (Ejec. - Prog)
		Programado	Logrado	
1	Docencia Universitaria	96.48	87.31	Avance Parcial
2	Investigación e Innovación	94.72	83.44	Avance Parcial
3	Extensión Universitaria	92.00	75.19	Avance Parcial
4	Gestión Institucional Universitaria	91.21	90.66	Avance Parcial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

AVANCE PROMEDIO POR PROYECTO
AL 31 de mayo 2016

Factor: 1 Docencia Universitaria

Nombre del Proyecto		% de Avance de las Actividades Programadas por Proyecto		Estado del Proyecto (Ejec. - Prog)
		Programado	Logrado	
1	Desarrollo de Estudios de Demanda Laboral en Ingeniería y Tecnología	100.00	87.50	Avance Parcial
2	Actualización e implementación de la guía para la elaboración de los programas de asignaturas	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria
3	Actualización y perfeccionamiento del personal docente	85.93	72.86	Avance Parcial
4	Sistema de Evaluación del desempeño docente y la conectividad con los procesos de selección, capacitación y contratación	100.00	88.89	Avance Parcial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

AVANCE PROMEDIO POR PROYECTO
AL 31 de mayo 2016

Factor: 2 Investigación e Innovación

Nombre del Proyecto		% de Avance de las Actividades Programadas por Proyecto		Estado del Proyecto (Ejec. - Prog)
		Programado	Logrado	
5	Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP	88.24	88.24	Avance Satisfactorio
6	Sistematización de la información relativa al grado de participación de los estudiantes de postgrado en trabajos de investigación	100.00	87.56	Avance Parcial
7	Fortalecimiento de los grupos de investigación y de estudio	95.24	93.81	Avance Parcial
8	Desarrollo e implementación de un Sistema de información de convenios y acuerdos nacionales e internacionales	90.91	90.91	Avance Satisfactorio
9	Reconocimiento para investigadores de la UTP a través del Programa de Incentivos, Estímulos y Premiación a la Investigación	100.00	64.29	Avance Parcial
10	Adquisición de Software con Licencias para la UTP	90.31	90.31	Avance Satisfactorio
11	Programa Institucional para el fortalecimiento de las actividades de investigación e innovación	98.35	67.16	Avance Parcial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

AVANCE PROMEDIO POR PROYECTO
AL 31 de mayo 2016

Factor: 3 Extensión Universitaria

Nombre del Proyecto		% de Avance de las Actividades Programadas por Proyecto		Estado del Proyecto (Ejec. - Prog)
		Programado	Logrado	
12	Desarrollo de Estudios de Necesidades de Extensión y Servicio a la Sociedad	100.00	87.50	Avance Parcial
13	Implementar un Sistema de Información en el marco de la internacionalización	88.65	88.65	Avance Satisfactorio
14	Desarrollo e implementación de un Sistema web de Gestión de Egresados y Graduados UTP	84.62	75.38	Avance Parcial
15	Reactivación de Asociación de Egresados de la UTP (ASETEC) y su vinculación con los egresados y graduados	94.74	49.23	Avance Parcial

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

AVANCE PROMEDIO POR PROYECTO
AL 31 de mayo 2016

Factor: 4 Gestión Institucional Universitaria

Nombre del Proyecto		% de Avance de las Actividades Programadas por Proyecto		Estado del Proyecto (Ejec. - Prog)
		Programado	Logrado	
16	Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017	100.00	96.70	Avance Parcial
17	Desarrollo e implementación de un Sistema Web de Registro y Seguimiento a la Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano de la UTP	80.00	80.00	Avance Satisfactorio
18	Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura	85.00	85.00	Avance Satisfactorio
19	Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la UTP	93.98	93.98	Avance Satisfactorio
20	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Laboratorios y Talleres a nivel nacional	95.82	95.82	Avance Satisfactorio
21	Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá	92.47	92.47	Avance Satisfactorio

ANEXO 3.

CUADROS DE REGISTRO DE AVANCE

EJECUTADO POR PROYECTO Y

ACTIVIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Factor: Docencia Universitaria
Componente: Políticas educativas y curriculares su relación con las necesidades de la sociedad
SubComponente: Modelo Curricular

Proyecto: 1 Desarrollo de Estudios de Demanda Laboral en Ingeniería y Tecnología

Objetivo: Determinar la naturaleza de la demanda y oferta de profesionales en el País

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE

Indicadores: Estudios de demanda de los perfiles profesionales y ocupacionales para el desarrollo del país y que consideran los requerimientos regionales e internacionales

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Desarrollo del estudio de campo realizado [2/2]	Informe del estudio de campo realizado	2014-12-01	2015-03-31	100.00	100.00	Conclusión Tardía		Estudio reprogramado debido a otras actividades prioritarias llevadas a cabo por la Unidad, pero para este periodo se reporta que este campo fué completado en su totalidad	La actividad fué culminada fuera del periodo programado	090.12.03.02.111: Informe del Listado de Empresas Encuestadas para el estudio de Demanda y Oferta de Profesionales, Técnicos y de Servicios de Extensión, año 2015. 090.12.03.02.150: Modelo de Encuestas Aplicadas para Estudio de Oferta y Demanda de Profesionales, Técnicos y de Servicios de Extensión, año 2015 (Evidencia reposa en DIPLAN)
Procesamiento de la información [2/2]	Reportes con la información consolidada	2015-02-01	2015-03-31	100.00	100.00	Conclusión Tardía		Estudio reprogramado debido a otras actividades prioritarias llevadas a cabo por la Unidad.	La actividad fue culminada fuera del periodo programado	004.01.04.02.200: Reporte y Gráficos del análisis estadístico para el estudio de Oferta y Demanda de Profesionales, Técnicos y de Servicios de Extensión, año 2015. (Evidencia reposa en DIPLAN)
Presentación y divulgación del Estudio a las autoridades y comunidad universitaria [2/2]	Informe de las actividades de divulgación realizadas	2015-05-01	2015-06-30	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	Estudio reprogramado debido a otras actividades prioritarias desarrolladas en la Unidad	El Documento Final se encuentra en elaboración para ser presentado ante las Autoridades y divulgado a nivel Institucional	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Resultados Generales del Proyecto

El Proyecto "Estudio de Demanda y Oferta de Profesionales, Técnicos y de Servicios de Extensión en la República de Panamá, año 2015" permitirá determinar la demanda y oferta de profesionales en ingeniería y tecnología que el país requiere, se encuentra actualmente en la fase de análisis de la información de la recolección de datos, para la elaboración del Documento final para entrega a finales del mes de agosto 2016.

Observaciones Generales del Proyecto

Este Estudio ha sido reprogramado debido a actividades prioritarias que desarrolla la Unidad ejecutora, afectando el cronograma de actividades establecido inicialmente, queda pendiente reportar el último indicador denominado "Análisis de la información y elaboración del Documento Final" para entrega a finales del mes de agosto 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Docencia Universitaria
Componente: Personal docente
SubComponente: Idoneidad y competencias

Unidades de Apoyo:
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL,
 FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE
 SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS

Proyecto: 3 Actualización y perfeccionamiento del personal docente

Indicadores:

Objetivo: Favorecer el desarrollo profesional del docente mediante procesos reflexivos que vinculen teoría y práctica en el nivel universitario

Porcentaje de docentes con formación de la especialidad y en docencia superior con relación al número de docentes que laboran en la universidad, Capacitación y desarrollo docente, Porcentaje de

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Diagnóstico de necesidades de formación (4/7)	Diagnóstico de necesidades	2015-08-01	2015-08-31	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	No se desarrollan acciones para detectar las necesidades de formación de los docentes.	Levantar un diagnóstico anual de necesidades de formación de los docentes.	
Diagnóstico de necesidades de formación (5/7)	Diagnóstico de necesidades	2015-11-01	2016-01-31	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	No se desarrollan acciones para detectar las necesidades de formación de los docentes.	Levantar un diagnóstico anual de necesidades de formación de los docentes.	
Diseño y programación de los cursos de capacitación [8/11]	Programación para los diferentes cursos	2015-08-01	2015-08-31	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	En el período de agosto 2015 no se hacen programaciones de cursos por parte de las Facultades ni de los Centros Regionales.	Se está en procesos de la realización de un diagnóstico de necesidades de formación del personal docente	
Diseño y programación de los cursos de capacitación [9/11]	programación para los diferentes cursos	2015-11-01	2016-01-31	100.00	80.00	Avance Parcial	Bajo	No todas las Facultades y Centros Regionales enviaron la programación de los cursos en el período solicitado.	Se está en procesos de la realización de un diagnóstico de necesidades de formación del personal docente	030.03.02.09.028: Circular VRA-C-057-2015 Reestructuración de la Plataforma Virtual - Cursos en Moodle y Jornada de Actualización para Docentes 030.03.02.09.148: Memorando VRA-M080-2015 Disposiciones para el Receso Académico - Verano 2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Docencia Universitaria
Componente: Personal docente
SubComponente: Idoneidad y competencias

Proyecto: 3 Actualización y perfeccionamiento del personal docente

Objetivo: Favorecer el desarrollo profesional del docente mediante procesos reflexivos que vinculen teoría y práctica en el nivel universitario

Unidades de Apoyo:

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS

Indicadores:

Porcentaje de docentes con formación de la especialidad y en docencia superior con relación al número de docentes que laboran en la universidad, Capacitación y desarrollo do030.03.02.09.148:

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Ofrecimiento de cursos de Docencia Superior Virtual (8/10)	Dos (2) cursos al año	2015-09-01	2015-11-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				030.03.02.09.148: Memorando VRA-M080-2015 Disposiciones para el Receso Académico - Verano 2016 030.03.02.09.028: Circular VRA-C-057-2015 Restructuración de la Plataforma Virtual - Cursos en Moodle y Jornada de Actualización para Docentes
Ofrecimiento de cursos de Docencia Superior Virtual (9/10)	Dos (2) cursos al año	2016-01-01	2016-02-29	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				030.03.02.09.148: Memorando VRA-M080-2015 Disposiciones para el Receso Académico - Verano 2016 030.03.02.09.164: Memorando VRA-M-083-2015 Capacitaciones en Receso Académico 030.03.02.09.138: Listado de Docentes Inscritos y Status de Aprobación del Curso Virtual de Docencia Superior

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Docencia Universitaria
Componente: Personal docente
SubComponente: Idoneidad y competencias

Proyecto: 3 Actualización y perfeccionamiento del personal docente

Objetivo: Favorecer el desarrollo profesional del docente mediante procesos reflexivos que vinculen teoría y práctica en el nivel universitario

Unidades de Apoyo:

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS

Indicadores:

Porcentaje de docentes con formación de la especialidad y en docencia superior con relación al número de docentes que laboran en la universidad, Capacitación y desarrollo docente, Porcentaje de

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Ofrecimiento de otros cursos varios de capacitación para docentes en el receso académico (4/4)	Cantidad de cursos impartidos	2016-01-01	2016-03-31	100.00	90.00	Avance Parcial	Bajo	No todos los cursos ofertados por Facultades y Centros Regionales fueron dictados debido a que los docentes no se inscribieron en ello.	Se está en procesos de la realización de un diagnóstico de necesidades de formación del personal docente	030.03.04.04.019: Capacitaciones del Receso Académico 2016 de: FIS-FII-CR AZUERO-CR COCLE - CR PANAMÁ OESTE-CR VERAGUAS. 030.03.04.04.027: Circular VRA-C-054-054-2015 Actividades de Investigación y Capacitación -Opciones 120 horas durante el Receso Académico Verano 2016. 030.03.02.09.148: Memorando VRA-M080-2015 Disposiciones para el Receso Académico - Verano 2016. 030.03.04.04.029: Circular VRA-C-42-2015 Capacitaciones del Receso Académico 2016. 030.03.04.04.154: Nota CEC-FII-16-01 Inscritos en Capacitaciones del Receso Académico 2016. 030.03.03.09.164: Memorando VRA-M-083-2015 Capacitaciones en Receso Académico. 030.03.04.04.193: Programa de Actividades a Desarrollar por los Docentes Tiempo Completo Receso Académico 2016 de CR Coclé
Ofrecimiento de capacitación docente en el aprendizaje y utilización del inglés como segundo idioma (3/3)	Un (1) curso anual	2016-01-01	2016-03-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				030.03.05.03.198: Recibo de pago de Congreso TESOL. 030.03.05.03.003: Afiche. 168.21.02.05.171: Nota RUTP-N-35-010-2016 Informa de los Proyectos de Inversión bajo su coordinación. 030.03.05.03.074: Formulario de donación de Congreso TESOL. 030.03.05.03.075: Foto Congreso TESOL-1. 030.03.05.03.076: Foto Congreso TESOL-2. 030.03.05.03.077: Foto Congreso TESOL-3. 030.03.05.03.022: Cheque para pago de Congreso TESOL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Docencia Universitaria
Componente: Personal docente
SubComponente: Idoneidad y competencias

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS

Proyecto: 3 Actualización y perfeccionamiento del personal docente

Indicadores:

Objetivo: Favorecer el desarrollo profesional del docente mediante procesos reflexivos que vinculen teoría y práctica en el nivel universitario

Porcentaje de docentes con formación de la especialidad y en docencia superior con relación al número de docentes que laboran en la universidad, Capacitación y desarrollo docente, Porcentaje de

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Seguimiento, evaluación y control al componente de capacitación y perfeccionamiento docente (7/10)	Informe de seguimiento	2015-04-01	2015-06-30	100.00	66.67	Avance Parcial	Medio	No se desarrollan acciones de seguimiento, evaluación y control de las capacitaciones.	Establecer mecanismos para el seguimiento, evaluación y control de las capacitaciones que se ofrecen a los docentes.	
Seguimiento, evaluación y control al componente de capacitación y perfeccionamiento docente (8/10)	Informe de seguimiento	2015-11-01	2016-01-31	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	No se desarrollan acciones de seguimiento, evaluación y control de las capacitaciones.	Establecer mecanismos para el seguimiento, evaluación y control de las capacitaciones que se ofrecen a los docentes.	
Seguimiento, evaluación y control al componente de capacitación y perfeccionamiento docente (9/10)	Informe de seguimiento	2016-04-01	2016-06-30	66.67	0.00	Sin Avance	Alto	No se desarrollan acciones de seguimiento, evaluación y control de las capacitaciones.	Establecer mecanismos para el seguimiento, evaluación y control de las capacitaciones que se ofrecen a los docentes.	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Resultados Generales del Proyecto

Se realizaron las gestiones conducentes al perfeccionamiento del personal docente a nivel nacional pero debido a las restricciones señaladas, no se alcanzó el porcentaje programado.

Observaciones Generales del Proyecto

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Docencia Universitaria
Componente: Políticas educativas y curriculares su relación con las necesidades de la sociedad
SubComponente: Planes de estudio y programas

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA,

Proyecto: 4 Sistema de Evaluación del desempeño docente y la conectividad con los procesos de selección, capacitación y contratación

Indicadores:

Actualizar el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente

Actualización y seguimiento del desarrollo del personal docente, Evaluación del desempeño docente, Seguimiento a la evaluación del desempeño con orientación para la mejora continúa,

Objetivo:

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Actualización y Mantenimiento del Sistema (3/3)	Sistema actualizado y en funcionamiento (detalle de adecuaciones, reportes del sistema)	2016-01-01	2016-04-30	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	Falta de personal en la Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones para atender lo solicitado, razón por la cual no contamos con respuesta.	Se han enviado notas para reiterar la solicitud a DITIC	025.04.07.03.175: Nota VRA-N-831-2016 Reiteración de solicitud de información. 025.04.07.03.176: Nota VRA-N-867-2015 Solicitud de información
Resultados Generales del Proyecto						Observaciones Generales del Proyecto				
El sistema automatiza la captación y procesamiento de las evaluaciones realizadas por el estudiante, el jefe de departamento y el propio docente (autoevaluación), permitiendo calcular la ponderación asignada a cada una de las evaluaciones, además de generar el reporte con la evaluación final.						Por motivos de falta de recurso humano, no se ha podido avanzar en la programación de los módulos de selección y capacitación, los cuales integrarán todo el sistema para el logro de la conectividad.				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Política y Gestión de Investigación e Innovación
SubComponente: Políticas institucionales

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN, CENTRO REG. DE CHIRIQUÍ, CENTRO REG. DE PANAMÁ OESTE, CENTRO REG. DE VERAGUAS, CENTRO DE INVEST.

Proyecto: 5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Planificación anual de actividades [5/5]	Documento de la programación anual	2016-01-01	2016-02-29	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				051.05.01.05.184: Plan anual de la DI 2016-2018
Organización, consecución y preparación de los recursos necesarios [12/15]	Informe de organización, consecución y preparación de los recursos necesarios	2015-08-01	2015-08-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				051.05.02.12.119: Invitación al Noveno evento del Ciclo de Conferencias de I+D+i (octubre 2015), 051.05.02.12.064: Documentos de solicitud de mobiliario y servicio para actividades (2015), 051.05.02.12.063: Documentos de formulario de servicios de audiovisual y prensa (grabar eventos, fotos, notas de prensa) (2015), 051.05.02.12.120: Invitación Octavo ciclo de conferencia I+D+i (2015), 051.05.02.12.227: Solicitud de salón para realizar actividades de Ciclo de conferencias I+D+i (2015), 051.05.02.12.226: Solicitud a conferencista a participar en el 8 ciclo de conferencias (2015), Currículo de los expositores

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Política y Gestión de Investigación e Innovación
SubComponente: Políticas institucionales

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN, CENTRO REG. DE CHIRIQUÍ, CENTRO REG. DE PANAMÁ OESTE, CENTRO REG. DE VERAGUAS, CENTRO DE INVEST.

Proyecto: 5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Organización, consecución y preparación de los recursos necesarios [13/15]	Informe de organización, consecución y preparación de los recursos necesarios	2016-02-01	2016-02-29	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				051.05.02.13.117: Invitación al 2 ciclo de conferencia I+D+i -2016, 051.05.02.13.118: Invitación al 3 ciclo de conferencia I+D+i - 2016, 051.05.02.13.065: Documentos de solicitud de mobiliarios y servicio para actividades (22 de enero de 2016), 051.05.02.13.066: Documentos de solicitud de servicios de audiovisuales y prensa (grabar los eventos, tomar fotos, nota de prensa de la actividad) (20 de enero de 2016), 051.05.02.13.052: Correos promoviendo las actividades de la DI (Talleres, Feria, JIC, otros), 051.05.02.13.045: Correo invitando al 1 Ciclo de conferencia I+D+i , 051.05.02.13.046: Correo invitando al Taller de Escritura de Artículos Científicos
Organización, consecución y preparación de los recursos necesarios [14/15]	Informe de organización, consecución y preparación de los recursos necesarios	2016-05-01	2016-05-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				051.05.02.14.024: Circular para la Organización de la Primera Feria Informativa-2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Política y Gestión de Investigación e Innovación
SubComponente: Políticas institucionales

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN, CENTRO REG. DE CHIRIQUÍ, CENTRO REG. DE PANAMÁ OESTE, CENTRO REG. DE VERAGUAS, CENTRO DE INVEST.

Proyecto: 5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Desarrollo de las actividades: ferias, seminarios, talleres, entre otros [11/15]	Programa de actividades y material utilizado	2015-06-01	2015-06-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				<p>051.05.03.11.043: Correo haciendo el cambio de fecha de la actividad.(Sexto Ciclo de Conferencias de I+D+i 2015), 051.05.03.11.195: Programa del Sexto Ciclo de Conferencia I+D+i (2 de julio de 2015), 051.05.03.11.213: Resumen CV del Expositor Dr. José Fábrega (Sexto Ciclo de Conferencias de I+D 2015), 051.05.03.11.047: Correos de Invitación y Correos de Respuesta al Séptimo evento del Ciclo de Conferencias de I+D julio 2015, 051.05.03.11.212: Resumen CV de Expositores Dr. Alexis Mojica, PhD y Mgter. María Luisa Singh Gustavino, 051.05.03.11.090: Imagen del sexto ciclo de conferencia I+D+i (2 de julio de 2015), 051.05.03.11.195: Programa de 7ma entrega del Ciclo de Conferencia de I+D+i (jueves 30 de julio de 2015), 051.05.03.11.133: Lista de Participantes a la 7ma entrega del Ciclo de Conferencias de I+D+i (jueves 30 de julio de 2015), 051.05.03.11.162: Nota de Prensa e Imágenes del VII Ciclo de Conferencia I+D+i (jueves 30 de julio de 2015)</p>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Política y Gestión de Investigación e Innovación
SubComponente: Políticas institucionales

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN, CENTRO REG. DE CHIRIQUÍ, CENTRO REG. DE PANAMÁ OESTE, CENTRO REG. DE VERAGUAS, CENTRO DE INVEST.

Proyecto: 5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Desarrollo de las actividades: ferias, seminarios, talleres, entre otros [12/15]	Programa de actividades y material utilizado	2015-09-01	2015-09-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				051.05.03.12.125: Lista de asistencia a la II Feria Informativa.-2015, 051.05.03.12.081: Fotos de los asistentes a la II Feria Informativa de la DI. 2015, 051.05.03.12.158: Nota de Prensa de la II Feria Informativa. - 2015, 051.05.03.12.080: Fotos de los participantes al 5 Congreso de Ciencia y Tecnología. 2015, 051.05.03.12.194: Programa del 5 Congreso de Ciencia y Tecnología, 051.05.03.12.160: Nota de Prensa del 5 Congreso de Ciencia y Tecnología, 051.05.03.12.192: Programa de 8va entrega del Ciclo de Conferencia de I+D+i (jueves 27 de agosto de 2015), 051.05.03.12.135: Lista de Participantes al Octavo Ciclo de Conferencia de I+D+i (jueves 27 de agosto de 2015), 051.05.03.12.161: Nota de Prensa e Imágenes al Octavo Ciclo de Conferencias I+D+i (jueves 27 de agosto de 2015), 051.05.03.12.190: Programación de Presentación 5 congreso, 051.05.03.12.048: Correos de la Dirección de Investigación Divulgando Diversas Actividades del Área de Investigación o de los Investigadores, 051.05.03.12.130: Lista de asistentes al congreso, 051.05.03.12.185: Plataforma del 5 Congreso
Desarrollo de las actividades: ferias, seminarios, talleres, entre otros [13/15]	Programa de actividades y material utilizado	2016-03-01	2016-03-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				051.05.03.13.134: Lista de Participantes a la I Feria Informativa, 051.05.03.13.092: Imágenes de la I Feria Informativa

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Política y Gestión de Investigación e Innovación
SubComponente: Políticas institucionales

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN, CENTRO REG. DE CHIRIQUÍ, CENTRO REG. DE PANAMÁ OESTE, CENTRO REG. DE VERAGUAS, CENTRO DE INVEST.

Proyecto: 5 Desarrollo de actividades de promoción, divulgación y apoyo a la I+D+i, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Diseñar un programa para la divulgación de políticas que promueven y regulan la investigación

Las políticas que promueven y regulan el desarrollo de la investigación se dan a conocer a docentes y estudiantes

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Seguimiento y evaluación de las actividades (11/15)	Informe y evaluación de actividades realizadas	2015-07-01	2015-07-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				051.05.04.11.098: Informe de Ciclos de Conferencias I+D, 051.05.04.11.214: Revista I+D+i.- 2015
Seguimiento y evaluación de las actividades (12/15)	Informe y evaluación de actividades realizadas	2015-10-01	2015-10-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				051.05.04.12.115: Informes de Ciclos de Conferencias I+D, 051.05.04.12.097: Informe de Asistencias a II Feria Informativa de la Dirección de Investigación, 051.05.04.12.149: Memoria de la Dirección de Investigación. - 2015, 051.05.04.12.216: Revista RIC. Nota de Prensa.- 2015, 051.05.04.12.215: Revista RIC. Correos invitando a publicar. - 2015, 051.05.04.12.197: Publicaciones del Primer Volumen de RIC. - 2015, 051.05.04.12.021: Catálogo de Publicaciones. Portada. -2015, 051.05.04.12.156: Nota de Prensa de Catálogo de Publicaciones.- 2015, 051.05.04.12.051: Correos Invitando a Publicar en Revista I+D+i Vol.II, N.2, 2015
Seguimiento y evaluación de las actividades (13/15)	Informe y evaluación de actividades realizadas	2016-04-01	2016-04-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				051.05.04.13.096: Informe de Asistencias a Ciclos de conferencias de I+D de 2016 de la Dirección de Investigación, 051.05.04.13.186: Power point del repositorio Institucional de la UTP., 051.05.04.13.104: Informe de I Feria Informativa DI, 2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Resultados Generales del Proyecto

El Proyecto 5, se ha podido realizar de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Investigación. Entre las actividades de divulgación y apoyo a la I+D+i que ha desarrollado la Dirección de Investigación para dar respuesta a este Proyecto esta la publicación del Volumen II, N. 2 de la Revista I+D+i del 2015, la cual se encuentra alojada y disponible en el sitio web de la UTP.

Observaciones Generales del Proyecto

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Política y Gestión de Investigación e Innovación
SubComponente: Políticas institucionales

Unidades de Apoyo: SECRETARÍA GENERAL, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN,

Proyecto: 6 Sistematización de la información relativa al grado de participación de los estudiantes de postgrado en trabajos de investigación

Indicadores:

Objetivo: Contar con un lineamiento que mida el nivel de participación de los estudiantes de los programas de postgrado profesionales y académicos en trabajos de investigación

Participación de los estudiantes de postgrados en trabajos de investigación

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Solicitud formal a las unidades académicas para la recopilación anual de la información y la designación de un personal de enlace [4/4]	Comunicación dirigida a unidades académicas para la recopilación anual de la información y la designación de un personal de enlace	2016-01-01	2016-01-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				053.06.05.04.033: Correo 1-04-16, dirigido a Decano, Vicedecanos, Coordinadores de Postgrado y Asistentes a la Coordinación de Postgrado, Centros Regionales. 053.06.05.04.035: Correo 20-04-16, dirigido a Vicedecanos de Investigación, Coordinadores de Postgrado y Asistentes a la Coordinación de Postgrado. 053.06.05.04.141: Llamadas telefónicas a Vicedecanos de Investigación, Coordinadores de Postgrado y Coordinación de Postgrado de Veraguas. 053.06.05.04.146: MEMO No. VIPE-DP-060-2016, 30-03-16. 053.06.05.04.147: MEMO No. VIPE-T-016-2015, 12-11-15
Recepción en Facultades de la información recopilada por parte de los Centros Regionales (3/3)	Nota remisoría de los Centros Regionales con la información recopilada en los formatos únicos	2015-11-01	2015-11-15	100.00	93.00	Avance Parcial	Bajo	Los Centros Regionales no están enviando la información a las Facultades, tal como lo indica el procedimiento. Los Centros Regionales envían la información directamente a la Dirección del Sistema de Estudios de Postgrado (DSEP).	La DSEP recibe la información directamente de los Centros Regionales y procesa la misma.	053.06.06.03.034: Correo 18-04-16, Coclé. 053.06.06.03.036: Correo 3-05-16, Colón. 053.06.06.03.037: Correo 5-04-16, Bocas del Toro. 053.06.06.03.038: Correo 5-04-16, Panamá Oeste. 053.06.06.03.039: Correo 7-04-16, Azuero. 053.06.06.03.168: Nota No. 0842-DR-UTPCh-2016, Chiriquí 053.06.06.03.170: Nota No. UTC-N-186-2016, Coclé
Revisión y consolidación de la info. por parte de la DSEP; y generación de reportes relativos al % anual de participación de estudiantes de postgrado en trabajos de investigación [3/3]	Cuadro resumen por Facultad y a nivel nacional, relativo al porcentaje de participación de estudiantes de postgrado en trabajos de investigación	2016-01-05	2016-02-15	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				053.06.08.03.061: Cuadro Resumen elaborado por la Dirección del Sistema de Estudios de Postgrado. 053.06.08.03.142: Matrícula Total de Postgrado por Sede, Facultad, Programa. (Primer Semestre 2015). 053.06.08.03.143: Matrícula Total de Postgrado por Sede, Facultad, Programa. (Segundo Semestre 2015). 053.06.08.03.144: Matrícula Total de Postgrado por Sede, Facultad, Programa. (Verano 2015)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Política y Gestión de Investigación e Innovación
SubComponente: Políticas institucionales

Unidades de Apoyo: SECRETARÍA GENERAL, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN,

Proyecto: 6 Sistematización de la información relativa al grado de participación de los estudiantes de postgrado en trabajos de investigación

Indicadores:

Objetivo: Contar con un lineamiento que mida el nivel de participación de los estudiantes de los programas de postgrado profesionales y académicos en trabajos de investigación

Participación de los estudiantes de postgrados en trabajos de investigación

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Revisión y consolidación por parte de las Facultades de la información generada tanto en los Centros Regionales como en la Sede; y entrega de la misma a la DSEP [3/3]	Nota remisoría de las Facultades con la información consolidada en los formatos únicos (Centros Regionales + Sede)	2015-11-16	2016-01-03	100.00	77.00	Avance Parcial	Bajo	Las Facultades no se ajustan al procedimiento establecido, ya que sólo procesan la información generada en la Sede y no la de los Centros Regionales. Matrícula de Eléctrica-I semestre 2015: No fue utilizada la matrícula de la Sede, registrada en el Informe generado por DIPLAN "Matrícula Total por Sede, según Facultad y Carrera". Se realizó un promedio entre la matrícula de Verano y II semestre 2015 (35 y 33) En el caso de la Maestría Científica de la Facultad de Sistemas, "Maestría en Ciencias de Tecnología de la Información y Comunicación", se tomaron las cifras del Informe enviado por la Facultad (matrícula y estudiantes que realizaron trabajos de investigación. Para este caso, no fue considerado el Informe generado por DIPLAN.	La DSEP incorpora la información generada por los Centros Regionales a la presente actividad para la obtención del porcentaje de avance. Reiteración de solicitud de información a través de memo. Reiteración por correo electrónico. Llamadas realizadas a Facultades y Centros Regionales	053.06.07.03.169: Nota No. FISC-CP-5-16, 12-01-16, Facultad de Sistemas.
Resultados Generales del Proyecto						Observaciones Generales del Proyecto				
Se consolidó la información recibida de Centros Regionales y Facultades; con lo cual, se elaboró el cuadro resumen de participación de estudiantes de postgrado en trabajos de investigación, obteniéndose el indicador basado en una muestra representativa del total de estudiantes que cursan programas de postgrado.						Se ha tenido dificultad para recopilación de la información tanto en Facultades como en Centros Regionales, por lo que la DSEP analizará estrategias conducentes a la obtención de la información.				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Política y Gestión de Investigación e Innovación
SubComponente: Normativa para la investigación y la innovación institucional
Proyecto: 7 Fortalecimiento de los grupos de investigación y de estudio

Unidades de Apoyo:
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Indicadores:

Objetivo: Dotar a la universidad con recursos humanos de calidad para la conformación de grupos de investigación de acuerdo a las políticas nacionales de desarrollo del país y atendiendo las tendencias globales

Lineamientos para la organización de grupos, líneas y proyectos de investigación

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Convocatoria para el fortalecimiento a los grupos de investigación y de estudio [3/3]	Evidencia del proceso de convocatoria	2016-01-01	2016-05-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		Las actividades asociadas a este Proyecto no se podrán realizar por falta de fondos.	En acción correctiva se ha organizado la Jornada de Iniciación Científica y la Revista de Iniciación Científica en donde los grupos de investigación podrán publicar los artículos de investigación que realicen.	058.07.02.03.136: Listado de Asistencia a Jornada de Iniciación Científica Bocas del Toro - 2016, 058.07.02.03.004: Afiche de Promoción de la JIC - 2016, 058.07.02.03.085: Grupos de Investigación Registrados en la Dirección de Investigación. - 2016, 058.07.02.03.018: Brochure para promocionar la JIC -2016, 058.07.02.03.079: Foto: Personal de la UTP, trabajando la Jornada de Iniciación Científica en la UDI- 2016, 058.07.02.03.094: Imágenes del taller jornada JIC 16-18-marzo 2016, 058.07.02.03.040: Correo con invitación a Jornada de Iniciación Científica 2016, 058.07.02.03.131: Lista de equipo que participa en la Organización de la JIC. -2016, 058.07.02.03.124: Link de la página de la Jornada de Iniciación Científica http://iniciacioncientifica.utp.ac.pa , 058.07.02.03.126: Lista de asistencia a la jornada de la JIC del 15-19 de febrero de 2016 (Centros Regionales de Coclé, Azuero y Veraguas), 058.07.02.03.159: Nota de Prensa de la jornada JIC 15-19 de febrero (Centros Regionales. Azuero, Coclé y Veraguas) 2016, 058.07.02.03.129: Lista de asistencia de participantes de la jornada JIC (Aquí participan docentes de diferentes Universidades que ofertan carrera de Ciencias y Tecnología) La JIC será financiada por la SENACYT, por 5, 058.07.02.03.157: Nota de Prensa de Evento del 29 de Febrero de 2016 de la JIC, 058.07.02.03.067: Entrega de notas de invitación para la Jornada de Iniciación Científica Nacional. Formulario con la firma de recibido de las instituciones visitadas,

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Política y Gestión de Investigación e Innovación
SubComponente: Normativa para la investigación y la innovación institucional
Proyecto: 7 Fortalecimiento de los grupos de investigación y de estudio

Unidades de Apoyo:
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Objetivo: Dotar a la universidad con recursos humanos de calidad para la conformación de grupos de investigación de acuerdo a las políticas nacionales de desarrollo del país y atendiendo las tendencias globales

Indicadores:
 Lineamientos para la organización de grupos, líneas y proyectos de investigación

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
										058.07.02.03.127: Lista de asistencia a Taller de Capacitación Científica. Participan otras Universidades, 058.07.03.03.053: Cuadros de grupos de investigación creados en 2016, 058.07.02.03.122: JIC. actividades con integrantes de otras Universidades, 058.07.02.03.094: Imágenes de Jornada Científica. Centro Regional de Veraguas
Negociación y adjudicación de las propuestas avaladas [2/3]	Propuestas adjudicadas	2015-04-01	2015-06-30	100.00	90.00	Avance Parcial	Bajo	Las actividades asociadas a este proyecto no se han podido realizar para el período 2014-2015 por falta de fondo.	Se han seleccionado entre los grupos de investigación los artículos que serán publicados en la Revista de Iniciación Científica como parte de las acciones correctivas que se vienen realizando para dar respuesta al Fortalecimiento de los grupos de investigación y de estudio.	058.07.03.02.106: Informe de la jornada JIC 2015 (informe, grupos participantes del evento, grupo ganador que representó a la UTP en el exterior, nota de prensa), 058.07.03.02.012: Artículos de la Jornada JIC, publicados en la Revista de Iniciación Científica, 058.07.03.02.116: Invitación del Grupo de investigación en Ingeniería y Ciencias ambientales de la FIC, invita a cierre de proyecto. 058.07.03.02.084: Fotos-Jic 2015. 058.07.03.02.095: Imágenes JIC Chiriquí-2015. 058.07.03.02.121: JIC Informe de Participación de las Facultades. 058.07.03.02.123: Jornada JIC-Chiriquí Nota de Prensa- 2015. 058.07.03.02.163: Nota de Prensa JIC-2015.
Negociación y adjudicación de las propuestas avaladas [3/3]	Propuestas adjudicadas	2016-04-01	2016-06-30	66.67	66.67	Avance Satisfactorio		Las actividades asociadas a este Proyecto no se podrán realizar por falta de fondos.		058.07.03.03.053: Cuadro con grupos de investigación creados en 2016, 058.07.03.03.082: Fotos: Diferentes universidades estatales y privadas que participan en la JIC.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Resultados Generales del Proyecto

El programa ha logrado la formación de nuevos grupos de investigación y la inserción de estudiantes a estos. A través de la Jornada de Investigación Científica(JIC), promueve la participación de los estudiantes en el área de investigación, también se crea la revista-RIC, para que los estudiantes puedan hacer sus publicaciones.

Observaciones Generales del Proyecto

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Política y Gestión de Investigación e Innovación
SubComponente: Normativa para la investigación y la innovación institucional

Unidades de Apoyo: FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN, CENTRO REG. DE

Proyecto: 8 Desarrollo e implementación de un Sistema de información de convenios y acuerdos nacionales e internacionales

Indicadores:

Objetivo: Realizar un inventario de los convenios nacionales e internacionales para que se use de referencia para las diferentes actividades que realiza la institución en términos académicos, de investigación, extensión y vinculación

Convenios o alianzas estratégicas para el fomento y desarrollo de investigaciones nacionales e internacionales

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Actualización y Mantenimiento del Sistema (4/6)	Sistema actualizado y en funcionamiento (detalle de adecuaciones, reportes del sistema)	2015-09-01	2015-11-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				059.08.06.04.235: Sitio web de Convenios de la UTP con Empresas, Instituciones y ONG: http://www.utp.ac.pa/institucion , 059.08.06.04.234: Sitio Web de Convenios Internacionales de la UTP: http://www.utp.ac.pa/listado-de-convenios-internacionales
Actualización y Mantenimiento del Sistema (5/6)	Sistema actualizado y en funcionamiento (detalle de adecuaciones, reportes del sistema)	2016-01-01	2016-02-29	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				059.08.06.05.042: Correo electrónico entre DITIC y Dirección de Extensión sobre las adecuaciones a la aplicación de Convenios Nacionales, http://www.utp.ac.pa/ministerio-de-relaciones-exteriores , 059.08.06.05.044: Correo invitación a capacitación del Sitio de Convenios UTP
Resultados Generales del Proyecto						Observaciones Generales del Proyecto				
Los convenios han sido actualizados en el sistema. DITIC, realizó la migración de la información de la aplicación de Convenios, la cual se encuentra en el Sitio de Convenios Nacionales e Internacionales, la misma está en funcionamiento y permite actualizar los convenios en línea y retirarlos de forma automática. DITIC, programó una capacitación para el 18 de mayo de 2016 con el personal de la Dirección de Extensión y Relaciones Internacionales para concluir y dar las indicaciones a seguir para la manejo del sistema.										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Organización de la investigación e innovación
SubComponente: Capacitación y promoción de los investigadores

Unidades de Apoyo:
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Proyecto: 9 Reconocimiento para investigadores de la UTP a través del Programa de Incentivos, Estímulos y Premiación a la Investigación

Indicadores:

Objetivo: Aumentar el número de proyectos I+D+i por áreas de investigación definidas de acuerdo a los sectores prioritarios del país.

Convenios o alianzas estratégicas para el fomento y desarrollo de investigaciones nacionales e internacionales

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Convocatoria del Programa de Incentivos, Estímulos y Premiación a la Investigación [3/3]	Informe de los resultados de la convocatoria	2015-09-01	2016-01-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				059.09.02.03.054: Formulario de descarga horaria por investigación 2015-2016, 059.09.02.03.155: Nota de Prensa - 2015, 059.09.02.03.011: Anuncios enviados por correos de las oportunidades de Cospivot 2015, 059.09.02.03.054: Cuadro de descarga horaria para docentes que hacen investigación 2016, 059.09.02.03.083: Fotos: Premio al investigador destacado y a los mejores tesis -2015
Adjudicación de los incentivos, estímulos y premios [3/3]	Informe de la Comisión de Asuntos de Investigación del CIPE	2016-02-01	2016-03-31	100.00	50.00	Avance Parcial	Medio	El reconocimiento de estímulo para los Investigadores, docentes y estudiantes que integran el Sistema Nacional de Investigación no se pudo realizar en el mes de abril de 2016, porque surgieron otras actividades a las que se les ha tenido que dedicar el espacio que se le había asignado a esta actividad. Sin embargo, la misma se realizará en julio de este año 2016.	La actividad se ha programado para julio del 2016.	059.09.02.03.054: Formulario con descargas horarias a docentes que realizan actividades de investigación -2016
Resultados Generales del Proyecto						Observaciones Generales del Proyecto				
<p>En el 2015 se hizo un reconocimiento al Investigador del año y a los mejores trabajos de tesis por Facultad, distinguiendo a los estudiantes y sus asesores.</p> <p>Se realizó reconocimiento a los estudiantes que participaron en la JIC, el grupo ganador recibió aporte para representar a la institución fuera del país.</p> <p>Para el 2016 se continua con el programa de descargas horarias a los docentes que realizan investigación, como parte de los estímulos por dedicarse a la investigación.</p>						<p>El programa de incentivos, estímulos y premiación a la investigación, esta en proceso de estructuración, sin embargo los objetivos del proyecto se están logrando a través de otras actividades.</p>				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COI

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Dotación de Recursos
SubComponente: Recursos tecnológicos (redes, bases de datos, software, etc)

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA,

Proyecto: 10 Adquisición de Software con Licencias para la UTP

Indicadores:

Objetivo: Adquirir software con licenciamiento para brindar el usuario final (administrativo, docente, estudiante o investigador) una herramienta que satisfaga las necesidades dependiendo de las funciones que realicen

Mantenimiento periódico de las TIC's

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Formulación de los requerimientos para adquisición de software a ser incorporados en el presupuesto UTP del año siguiente [5/5]	Documento que evidencien la solicitud de fondos vía presupuesto de la UTP	2016-02-01	2016-02-29	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		Para los requerimientos de adquisición de software a ser incorporados en el presupuesto del siguiente año, se espera la notificación de la VIAD, donde se indica que se da la apertura a la capacitación del anteproyecto de Presupuesto, en caso de que los fondos solicitados estén relacionados al proyecto de funcionamiento.	El reservado de los fondos puede ser indicado, desde la VIAD por medio del Proyecto de Inversiones con el nombre de: Mejoramiento del Centro de Datos-UTP. En este caso la notificación se envía en el transcurso del año en curso.	075.10.02.05.145: Memo DIPLAN-DP-M-001-16, 075.10.02.05.172: Nota RUTP-N-35-015-2016, 075.10.02.05.025: Circular VIAD-C-06-16
Realización de los trámites requeridos para la adquisición de los softwares [4/5]	Documentos que evidencien los trámites de compras realizados	2015-05-01	2015-12-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				075.10.03.04.217: SBSE 12015-1992 Antivirus PC, 075.10.03.04.218: SBSE 12015-2454 Antivirus servidores, 075.10.03.04.219: SBSE 12015-2460 Microsoft
Realización de los trámites requeridos para la adquisición de los softwares [5/5]	Documentos que evidencien los trámites de compras realizados	2016-05-01	2016-12-31	12.30	12.30	Avance Satisfactorio				075.10.03.04.220: SBSE 12016-1306 Microsoft, 075.10.03.04.221: SBSE12016-1208 Antivirus PC, 075.10.03.04.223: SBSE12016-1213 Antivirus Servidores

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COI

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Dotación de Recursos
SubComponente: Recursos tecnológicos (redes, bases de datos, software, etc)

Unidades de Apoyo:
 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA,
 VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL,
 FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA,

Proyecto: 10 Adquisición de Software con Licencias para la UTP

Indicadores:

Objetivo: Adquirir software con licenciamiento para brindar el usuario final (administrativo, docente, estudiante o investigador) una herramienta que satisfaga las necesidades dependiendo de las funciones que realicen

Mantenimiento periódico de las TIC's

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Instalación o actualización de los software adquiridos con anterioridad a nivel nacional (11/15)	Inventario de software instalado a nivel nacional	2015-08-01	2015-08-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				075.10.04.11.099: Informe de Consumo de Licencias agosto_2015
Instalación o actualización de los software adquiridos con anterioridad a nivel nacional (12/15)	Inventario de software instalado a nivel nacional	2015-12-01	2015-12-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				075.10.04.12.100: Informe de Consumo de Licencias enero_febrero_2016
Instalación o actualización de los software adquiridos con anterioridad a nivel nacional (13/15)	Inventario de software instalado a nivel nacional	2016-04-01	2016-04-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				075.10.04.13.101: Informe de Consumo de Licencias Mayo2016
Seguimiento de las instalaciones o actualizaciones de software realizadas anteriormente (11/14)	Informe de seguimiento	2015-09-01	2015-09-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				075.10.05.11.013: Aviso del 25 septiembre 2015 sobre actualización de servidores

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COI

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Dotación de Recursos
SubComponente: Recursos tecnológicos (redes, bases de datos, software, etc)

Unidades de Apoyo:
 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA,
 VICERRECTORÍA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL,
 FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA,

Proyecto: 10 Adquisición de Software con Licencias para la UTP

Indicadores:

Objetivo: Adquirir software con licenciamiento para brindar el usuario final (administrativo, docente, estudiante o investigador) una herramienta que satisfaga las necesidades dependiendo de las funciones que realicen

Mantenimiento periódico de las TIC's

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Seguimiento de las instalaciones o actualizaciones de software realizadas anteriormente (12/14)	Informe de seguimiento	2016-01-01	2016-01-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				075.10.05.12.030: Circular/DITIC/C/01/16
Seguimiento de las instalaciones o actualizaciones de software realizadas anteriormente (13/14)	Informe de seguimiento	2016-05-01	2016-05-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				075.10.05.13.023: Circular DITIC/04/16, 075.10.05.13.166: Nota DITIC/086/16, 075.10.05.13.167: Nota DITIC/287/14, 075.10.05.13.232: Nota del Centro Regional Coclé sobre actualización del windows
Resultados Generales del Proyecto						Observaciones Generales del Proyecto				
La UTP ha continuado el proceso de adquisición e instalación de una serie de software actualizados y con licenciamiento para las diferentes instancias universitarias (docencia, investigación, extensión y administración) a nivel nacional, lo que ha permitido iniciar el proceso de estandarización de los software requeridos para satisfacer las necesidades en esta materia. A la fecha se han adquirido e instalado una gran cantidad de software de ofimática y software especial.						El cambio de administración en la Unidad Coordinadora del Proyecto, ha dado lugar a la designación de nuevo personal responsable del proyecto, y se está trabajando en aras de retomar lo realizado con anterioridad y darle continuidad a las acciones requeridas para el cumplimiento de lo pactado. Se han realizado los trámites necesarios para la inclusión en el presupuesto 2017 (aunque ya no forma parte del quinquenio acordado) de la compra de Licencias de Software y se ha avanzado en la adquisición de software para el año 2016.				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Dotación de Recursos
SubComponente: Recursos financieros, económicos, administrativos y físicos

Unidades de Apoyo:
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Proyecto: 11 Programa Institucional para el fortalecimiento de las actividades de investigación e innovación

Indicadores:

Objetivo: Promover y fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Recursos económicos asignados a investigación en el presupuesto institucional que corresponden a la planificación y ejecución de las actividades de investigación e innovación

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Organización del Programa [5/5]	Evidencia de la organización	2015-07-01	2015-09-30	100.00	50.00	Avance Parcial	Medio	Parte de las actividades propuestas para el programa no se han realizado por falta de presupuesto. Sin embargo, las descargas horarias programadas se han ejecutado.	Se ha realizado un convenio con SENACYT, que es una alternativa.	079.11.03.05.032: Convenio con SENACYT (Reposa en Dirección de Investigación), 059.09.02.03.054: Cuadro de descarga horaria para docentes que hacen investigación 2016
Apertura y Recepción de Propuestas [4/4]	Acta de Reunión	2015-10-01	2015-11-30	100.00	50.00	Avance Parcial	Medio	Las actividades de este proyecto no se han podido realizar por falta de presupuesto.	Dentro del proyecto de Insumos por Proyecto para el año 2015 se han destinado fondos para el fortalecimiento a nivel institucional de las actividades de investigación e innovación a través del Proyecto de Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, de lo cual se ejecutó 161.299.	079.11.04.04.102: Informe de Ejecución Presupuestaria Diciembre 2015
Evaluación por Comité de Evaluación de pares externos (4/4)	Informe de Evaluación	2015-12-01	2016-03-31	100.00	60.00	Avance Parcial	Medio	Las actividades para proyectos no se han podido ejecutar por falta de presupuesto.	Dentro del Presupuesto de Inversión por Proyectos para el año 2016 se han destinado fondos para el fortalecimiento a nivel institucional de las actividades de investigación e innovación a través del Proyecto de Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación a la cual se le asignó B/.170.020 para el mes de marzo del 2016. Igualmente se ha invertido para mejoramiento de laboratorios de Facultades y Centros Regionales, B/.285.580	079.11.05.04.057: Cuadro de Presupuesto de Inversiones para Proyecto al 30 de marzo de 2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Dotación de Recursos
SubComponente: Recursos financieros, económicos, administrativos y físicos

Unidades de Apoyo:
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Proyecto: 11 Programa Institucional para el fortalecimiento de las actividades de investigación e innovación

Indicadores:

Objetivo: Promover y fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Recursos económicos asignados a investigación en el presupuesto institucional que corresponden a la planificación y ejecución de las actividades de investigación e innovación

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Selección de propuestas avaladas por el Comité de Recepción (4/4)	Publicación de Convocatoria	2016-04-01	2016-05-31	100.00	40.00	Avance Parcial	Alto	Las actividades del proyecto no se han realizado por falta de presupuesto.	La Oficina de Apoyo al Investigador de la Dirección de Investigación, ofrece a docentes, investigadores, estudiantes y administrativos, información, apoyo, asesoría en áreas relacionadas a la investigación. Asesorando proyectos, contactando con instituciones internacionales, etc.	079.11.06.04.059: Cuadro de propuestas avaladas por SENACYT, 079.11.06.04.132: Lista de la Oficina de Apoyo al investigador, (asesoría a profesores, investigadores y estudiantes) para la presentación de propuestas y la búsqueda de fondos
Negociación y adjudicación de las propuestas avaladas (4/5)	Informe de resultados de convocatorias	2015-04-01	2015-06-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		Las actividades de este proyecto no se han reiniciado en el periodo 2014-2015 por falta de fondos.	Dentro del Presupuesto de Inversiones por Proyecto para el año 2015 se han destinado fondos para el fortalecimiento a nivel institucional de las actividades de investigación e innovación a través del Proyecto de Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, de lo cual se lleva al 30 de junio de 2015 ejecutado el 98 por ciento del presupuesto asignado.	079.11.07.04.058: Cuadro de Presupuesto de Inversiones por Proyecto al 30 de junio de 2015. (Tomado del Informe de Ejecución Presupuestaria junio 2015)
Negociación y adjudicación de las propuestas avaladas (5/5)	Informe de resultados de convocatorias	2016-04-01	2016-06-30	66.67	50.00	Avance Parcial	Bajo	Este programa no se ha ejecutado por falta de fondos.	Se han establecido otras actividades para cumplir para el proyecto, como es un convenio con Senacyt, que consiste en un aporte económico durante 4 años para realizar la JIC. Se asignado del Presupuesto institucional destinado al Fortalecimiento de la Ciencia y Tecnología e Innovación, B/.94,500, mejoramiento de laboratorios de Facultades y Centros Reg. B/.102,874. Cuadro N.8 Presupuesto de Inversiones por Proyecto. Abril 30 de 2016.	079.11.06.04.132: Lista de la Oficina de Apoyo al Investigador, (asesoría a profesores, investigadores y estudiantes) para la presentación de propuestas y la búsqueda de fondos, 079.11.03.05.032: Convenio con SENACYT, para aporte de la JIC, 079.11.07.05.060: Cuadro N.8. Presupuesto de Inversiones por Proyectos.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Factor: Investigación e Innovación
Componente: Dotación de Recursos
SubComponente: Recursos financieros, económicos, administrativos y físicos

Unidades de Apoyo:
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Proyecto: 11 Programa Institucional para el fortalecimiento de las actividades de investigación e innovación

Indicadores:

Objetivo: Promover y fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Recursos económicos asignados a investigación en el presupuesto institucional que corresponden a la planificación y ejecución de las actividades de investigación e innovación

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Seguimiento y Fiscalización del programa	Informes de Avances de Proyectos. Informe Final de los proyectos. Publicaciones de los proyectos	2013-07-01	2016-08-31	92.05	29.00	Avance Parcial	Alto	Las actividades de este proyecto no se han reiniciado en el periodo 2014-2015 por falta de fondos. Sin embargo, a través del Presupuesto de Inversiones la UTP ha destinado fondos para las actividades de investigación e innovación.	Dentro del Presupuesto de Inversiones por Proyecto para los años 2014 y 2015 se han destinado fondos para el fortalecimiento a nivel institucional de las actividades de investigación e innovación a través del Proyecto de Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación, de lo cual se destinó al 30 de diciembre de 2014 en el presupuesto ejecutado B/.395,000.00 y al 30 de mayo de 2015 se ha ejecutado B/.93,578.00. En la adquisición de equipamiento para Facultades y Centros Regionales.	
Resultados Generales del Proyecto						Observaciones Generales del Proyecto				
<p>El Programa UTP-Investiga, que forma parte de este Proyecto 11, no ha contado con presupuesto para su desarrollo. Sin embargo, se han realizado otras actividades que han permitido lograr el objetivo del mismo.</p> <p>Dentro de las actividades propuestas para fortalecer las actividades de investigación, esta el financiamiento del programa Jornada de Investigación Científica (JIC), con el apoyo de SENACYT. Las descargas horarias, que permite a los docentes realizar investigación, se ha cumplido.</p>										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Factor: Extensión Universitaria
Componente: Políticas de extensión
SubComponente: Planes, programas, proyectos y actividades de extensión y servicios

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE

Proyecto: 12 Desarrollo de Estudios de Necesidades de Extensión y Servicio a la Sociedad

Indicadores:

Objetivo: Determinar las necesidades que tiene la sociedad, a través de sus sectores productivos

Estudios de las necesidades de extensión y servicios, para la sociedad

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Desarrollo del Estudio del Campo [2/2]	Informe del estudio de campo realizado	2014-12-01	2015-03-31	100.00	100.00	Conclusión Tardía		Estudio reprogramado debido a otras actividades prioritarias llevadas a cabo por la Unidad. Pero para este periodo se reporta que campo fue completado en su totalidad	La actividad fue culminada fuera de periodo programado	090.12.03.02.109: Informe del Listado de las Empresas Encuestadas para Estudio de Demanda y Oferta de Profesionales, Técnicos y de Servicios de Extensión, año 2015. 090.12.03.02.150: Modelo de Encuestas Aplicadas para Estudio de Oferta y Demanda de Profesionales, Técnicos y de Servicios de Extensión, año 2015 (Evidencia reposa en DIPLAN)
Procesamiento de la información [2/2]	Reportes con la información consolidada	2015-02-01	2015-03-31	100.00	100.00	Conclusión Tardía		Estudio reprogramado debido a otras actividades prioritarias llevadas a cabo por la Unidad.	La actividad fue culminada fuera de periodo programado	004.01.04.02.200: Reporte y Gráficos del análisis de la muestra para el Estudio de Oferta y Demanda de Profesionales, Técnicos y de Servicios de Extensión, año 2015. (Evidencia reposa en DIPLAN)
Presentación y divulgación del Estudio a las autoridades y comunidad universitaria (2/2)	Informe de las actividades de divulgación realizadas	2015-06-01	2015-08-31	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	Estudio reprogramado debido a actividades prioritarias que se desarrollan en la Unidad.	El Documento Final se encuentra en elaboración para ser presentado ante las Autoridades y Divulgado a nivel Institucional	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Resultados Generales del Proyecto

Con el Proyecto "Estudio de Demanda y Oferta de Profesionales, Técnicos y de Servicios de Extensión en la República de Panamá, año 2015", se determinarán la demanda potencial de servicios de extensión, a través de sus sectores productivos, se encuentra actualmente en la fase de análisis de la información de la recolección de datos, para la elaboración del Documento final para entrega a finales del mes de agosto 2016.

Observaciones Generales del Proyecto

Este Estudio ha sido reprogramado debido a actividades prioritarias que desarrolla la Unidad ejecutora, afectando el cronograma de actividades establecido inicialmente, queda pendiente reportar el último indicador denominado "Análisis de la información y elaboración del Documento Final" para entrega a finales del mes de agosto 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

Factor: Extensión Universitaria
Componente: Relaciones con instituciones externas nacionales e internacionales
SubComponente: Vínculos

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ,

Proyecto: 13 Implementar un Sistema de Información en el marco de la internacionalización

Indicadores:

Objetivo: Fortalecer la internacionalización mediante la apropiación e involucramiento de todos los estamentos, para el logro de una mayor participación en los distintos programas internacionales e interculturales

Intercambio y movilidad de docentes, estudiantes y personal administrativo a nivel internacional

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Sesiones Presenciales de información, comunicación y orientación sobre los Programas Internacionales (5/7)	Lista de control de asistencia a sesiones presenciales	2015-08-01	2015-09-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				104.13.01.05.224: Sesiones Informativas realizadas durante los meses junio, julio, agosto y septiembre 2015, 104.13.01.05.229: Visitas de estudiantes internacionales a la UTP jun, jul, sep 2015. 104.13.01.05.069: Feria de Becas y Oportunidades Internacionales, 104.13.01.05.014: Bienvenida a estudiantes de intercambio Julio 2015, 104.13.01.05.179: Pasantía estudiantes de Francia 2015
Sesiones Presenciales de información, comunicación y orientación sobre los Programas Internacionales (6/7)	Lista de control de asistencia a sesiones presenciales	2016-05-01	2016-05-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				104.13.01.06.223: Segunda Feria de Becas y Oportunidades Internacionales, 104.13.01.06.015: Bienvenida Intercambio del Primer Semestre del 2016, 104.13.01.06.225: Sesiones informativas realizadas los meses de febrero, marzo y abril 2016, 104.13.01.06.228: Stand Informativo Seminario de Inducción Universitaria, 104.13.01.06.128: Lista de Asistencia Bienvenida a Estudiantes Internacionales I Semestre, Listas de Asistencia a Sesiones Informativas Febrero, Marzo y Abril 2016
Publicación continua de las oportunidades de programas internacionales a nivel nacional (8/10)	Distribución de afiches colocados, de separadores, de visitantes a redes sociales	2015-08-01	2015-11-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				Publicación a través de la Pag Web UTP de la Firma de Convenios UTP-HUAWEI "Programa de Semilla para el Futuro" y UTP-UTSEM México, Boletín Informativo N°4, N°5 y N°6 (Correo masivo a la Comunidad UTP), Afiche Feria de Becas y Oportunidades Internacionales

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES

Factor: Extensión Universitaria
Componente: Relaciones con instituciones externas nacionales e internacionales
SubComponente: Vínculos

Unidades de Apoyo: DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ,

Proyecto: 13 Implementar un Sistema de Información en el marco de la internacionalización

Indicadores:

Objetivo: Fortalecer la internacionalización mediante la apropiación e involucramiento de todos los estamentos, para el logro de una mayor participación en los distintos programas internacionales e interculturales

Intercambio y movilidad de docentes, estudiantes y personal administrativo a nivel internacional

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Publicación continua de las oportunidades de programas internacionales a nivel nacional (9/10)	Distribución de afiches colocados, de separadores, de visitantes a redes sociales	2016-03-01	2016-03-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				104.13.02.09.007: Afiche Segunda Feria de Becas y Oportunidades Internacionales, 104.13.02.09.231: Volantes Study Abroad in Panama, 104.13.02.09.020: Catálogo de Capacidades por área temática, especialidades y grupos de investigación, 104.13.02.09.020: Boletín informativo N°7 y N°8 (Correo masivo a la Comunidad UTP)
Actualización de la Página "UTP Sin Fronteras" en Facebook y TWITTER	Página actualizada mensualmente	2014-11-01	2016-12-31	72.95	72.95	Avance Satisfactorio				104.13.05.00.009: Anuncio Red Social Facebook "UTP Internacional", Dirección de Relaciones Internacionales, 104.13.05.00.010: Anuncio Red Social Twitter "UTP Internacional", Dirección de Relaciones Internacionales, Evidencia en el Tercer Informe (1/06/2014 al 31/05/2015)
<p style="text-align: center;">Resultados Generales del Proyecto</p> <p>Se llevaron a cabo las Sesiones Informativas en el Campus Central UTP y en los CR de Chiriquí, Coclé, Azuero y Veraguas, beneficiando a un número de estudiantes. De igual manera, se logró que a través del Programa "Semillas para el Futuro" la Compañía Huawei de China ofreciera una charla informativa a estudiantes de la Fac. de Sistemas Computacionales y la Fac. de Ing. Eléctrica permitiendo que estudiantes tengan la oportunidad de viajar a China-Beijing por tres (3) semanas. También es importante resaltar, que durante este periodo se llevó a cabo la I y II Feria de Becas y Oportunidades Internacionales donde se contó con exhibición de stands y ronda de conferencias de embajadas de países acreditadas en nuestro país así como la participación de instituciones que ofrecen becas a panameños. Las redes sociales (Facebook y Twitter) se han vuelto una parte integral en los jóvenes por lo que se trabajó en la modificación de la imagen de enlace de Facebook "UTP SIN FRONTERA" A "UTP INTERNACIONAL" para tener un mayor efecto, logrando que 3,374 personas visitaran la página y permitiendo que los eventos organizados por la DRI, sean vistos y tengan una mayor participación los estudiantes de la UTP. Así mismo se tiene 1,342 seguidores en Twitter.</p> <p>También se levantaron folletos de información como "Programas de Movilidad Estudiantil de la UTP al Exterior", STUDY ABROAD IN PANAMA y volantes informando sobre las Becas para intercambio estudiantil en Europa (SUSTAIN Y CRUZ DEL SUR). Así mismo, se levantó un Catálogo de Capacidades en las áreas de Investigación para ser distribuidos en las reuniones, lobby y eventos internacionales.</p> <p>Con la reestructuración de la Página Web de la UTP, la Dirección de Relaciones Internacionales (DRI) logró ofrecer mayor información sobre Becas de Pregrado (Licenciaturas) y Postgrado, Cursos y Convocatorias para proyectos internacionales. Introducir fotos y/o diseños de las propagandas para divulgar las sesiones informativas.</p>						<p style="text-align: center;">Observaciones Generales del Proyecto</p>				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Factor: Extensión Universitaria
Componente: Graduados
SubComponente: Vinculación de la Universidad con los graduados

Unidades de Apoyo: SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y

Proyecto: 14 Desarrollo e implementación de un Sistema web de Gestión de Egresados y Graduados UTP

Indicadores:

Objetivo: Lograr contactos y canales de comunicación vinculando a los egresados y graduados de la UTP, mediante el desarrollo de un red social de participantes

Contacto y canales de comunicación establecidos con los graduados

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Actualización y Mantenimiento del Sistema (2/5)	Sistema actualizado y en funcionamiento	2015-04-01	2015-06-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				111.14.05.02.087: http://alumni.utp.ac.pa/blog/ , 111.14.05.02.233: www.utp.ac.pa/sitio-de-intercambio-social-de-graduados
Actualización y Mantenimiento del Sistema (3/5)	Sistema actualizado y en funcionamiento	2015-09-01	2015-10-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		El Sistema ALUMNI UTP, será reemplazado por el Sistema de Seguimiento y Actualización de Egresados (SISAE).	En reuniones sostenidas entre VRA, DIPLAN y Dirección de Extensión, surgió la iniciativa de implementar y adecuar a nuestras necesidades el "Sistema de Seguimiento y Actualización de Egresados" utilizado en el Centro Regional de Azuero y diseñado por la Coordinadora de la Unidad de Gestión de Proyectos del Centro. Al Sistema se le realizarán desarrollos adicionales, ajustes y adecuaciones para integrar algunas variables que son necesarias para hacer las encuestas de seguimiento y los informes por carrera y Facultad que serán de utilidad para DIPLAN.	111.14.05.03.078: Foto de reunión sostenida entre VRA, CRA y Dirección de Extensión el 25/09/2015, acerca del Sistema de Seguimiento a Egresados, 111.14.05.03.001: Acuerdo de la Reunión del 30/09/15 con DIPLAN, 111.14.05.03.086: http://alumni.utp.ac.pa/becas-senacy/ , 111.14.05.03.049: Correos electrónicos 2015, 111.14.05.03.180: PDF de la propuesta del SISAE
Actualización y Mantenimiento del Sistema (4/5)	Sistema actualizado y en funcionamiento	2016-01-01	2016-03-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria			En la reunión del 9 de marzo 2016, se estableció la Comisión para diseñar un sistema integrado para el seguimiento a egresados, con miras a cumplir con estándares internacionales de calidad establecidos en los procesos de acreditación.	111.14.05.04.050: Correos electrónicos 2016, 111.14.05.04.174: Nota VRA-N-449-2016. Invitación a Reunión de Seguimiento a Egresados

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Factor: Extensión Universitaria
Componente: Graduados
SubComponente: Vinculación de la Universidad con los graduados

Unidades de Apoyo: SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y

Proyecto: 14 Desarrollo e implementación de un Sistema web de Gestión de Egresados y Graduados UTP

Indicadores:

Objetivo: Lograr contactos y canales de comunicación vinculando a los egresados y graduados de la UTP, mediante el desarrollo de un red social de participantes

Contacto y canales de comunicación establecidos con los graduados

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Monitoreo periódico al sistema para el seguimiento y mejoramiento de los servicios a partir de las sugerencias de los graduados (1/4)	Se deben generar reportes que indiquen el porcentaje de estudiantes que respondieron la encuesta	2015-04-01	2015-06-30	100.00	80.00	Avance Parcial	Bajo	Falta implementar la herramienta para monitoreo del sistema. En reunión sostenida con VRA, DIPLAN y Dirección de Extensión, se acordó que no era competencia de la Dirección de Extensión aplicar Encuestas a los graduados.	Se levantó el cuestionario en Google Drive, para exportarlo al Sistema y posteriormente generar los reportes correspondientes. DITIC realizará la implementación de la herramienta dentro del sistema, para el monitoreo periódico como parte del seguimiento y mejoramiento de los servicios a partir de las sugerencias de los egresados.	111.14.06.01.093: Imágenes del cuestionario.
Monitoreo periódico al sistema para el seguimiento y mejoramiento de los servicios a partir de las sugerencias de los graduados (2/4)	Se deben generar reportes que indiquen el porcentaje de estudiantes que respondieron la encuesta	2015-09-01	2015-10-31	100.00	50.00	Avance Parcial	Medio	El Sistema ALUMNI UTP, será reemplazado por el SISAE.	En reuniones sostenidas entre VRA, DIPLAN y Dirección de Extensión, surgió la iniciativa de implementar y adecuar a nuestras necesidades el "Sistema de Seguimiento y Actualización de Egresados" utilizado en el Centro Regional de Azuero y diseñado por la Coordinadora de la Unidad de Gestión de Proyectos del Centro. Se realizarán desarrollos adicionales, ajustes y adecuaciones para integrar algunas variables que son necesarias para hacer las encuestas de seguimiento y los informes por carrera y Facultad que serán de utilidad para DIPLAN. Esta información servirá para el monitoreo periódico, el cual será un Sistema integrado.	111.14.06.02.088: Nota VIPE-DE-119-2015, del 29 de septiembre de 2015, 111.14.06.02.088: http://andromeda.ls.utp.ac.pa/egresadosutp/ Aplicación del CRA, la cual se adecuará a nuestras necesidades, 111.14.05.03.078: Foto de reunión sostenida con VRA, CRA y Dirección de Extensión el 25/09/2015, acerca del Sistema Integrado de Seguimiento y Actualización de Egresados, 111.14.05.03.001: Acuerdo de la Reunión del 30/09/15 con DIPLAN, 111.14.05.03.180: PDF de la propuesta del SISAE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Factor: Extensión Universitaria
Componente: Graduados
SubComponente: Vinculación de la Universidad con los graduados

Unidades de Apoyo: SECRETARÍA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y

Proyecto: 14 Desarrollo e implementación de un Sistema web de Gestión de Egresados y Graduados UTP

Indicadores:

Objetivo: Lograr contactos y canales de comunicación vinculando a los egresados y graduados de la UTP, mediante el desarrollo de un red social de participantes

Contacto y canales de comunicación establecidos con los graduados

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Monitoreo periódico al sistema para el seguimiento y mejoramiento de los servicios a partir de las sugerencias de los graduados (3/4)	Se deben generar reportes que indiquen el porcentaje de estudiantes que respondieron la encuesta	2016-01-01	2016-03-31	100.00	50.00	Avance Parcial	Medio	El Sistema ALUMNI UTP, será reemplazado por el SISAE.	Se estableció la Comisión para diseñar el "Sistema de Seguimiento y Actualización de Egresados", con miras a cumplir con estándares internacionales de calidad establecidos en los procesos de acreditación. En reunión de Seguimiento a Egresados del 10 de mayo de 2016 se acordó la validación del SISAE en el mes de agosto de 2016.	111.14.06.03.137: Listado de Asistencia a reunión de Seguimiento a Egresados, del 10 de mayo de 2016, 111.14.05.04.174: Nota VRA-N-449-2016. Invitación a Reunión de Seguimiento a Egresados, 111.14.06.03.002: Acuerdo de Reunión del 10 de mayo de 2016
Resultados Generales del Proyecto						Observaciones Generales del Proyecto				
<p>El Sistema ALUMNI UTP, será reemplazado por el "Sistema de Seguimiento y Actualización de Egresados" (SISAE) utilizado en el Centro Regional de Azuero, el cual está siendo adecuado a los requerimientos tanto de Facultades, VRA, DIPLAN y la Dirección de Extensión para el seguimiento a egresados.</p> <p>Cabe señalar que se incorporará un buzón de sugerencias sobre los servicios a egresados, del cual se realizarán los monitoreos.</p> <p>El estatus actual del "Sistema de Seguimiento y Actualización de Egresados" (SISAE) se encuentra en la fase de validación de Módulos: Controles de seguridad, usuario de egresados, ingresar coordinador de la Carrera por Facultad, Consulta de Egresados, Publicación de noticias, Control de asistencia de los egresados, link de la bolsa de trabajo e incorporación de un buzón de sugerencias sobre los servicios a egresados.</p>										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Factor: Extensión Universitaria
Componente: Graduados
SubComponente: Vinculación de la Universidad con los graduados

Unidades de Apoyo:
 FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN, CENTRO REG. DE

Proyecto: 15 Reactivación de Asociación de Egresados de la UTP (ASETEC) y su vinculación con los egresados y graduados

Indicadores:

Objetivo: Reactivar las actividades de vinculación de la ASETEC con nuestra Institución, tales como participación en el fortalecimiento de planes y programas de estudios, evaluación y desarrollo de nuevas actividades que se conjuguen en

Agrupaciones formalmente constituidas de los graduados

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Consultas legales para determinar los pasos para conformar la nueva Junta Directiva (2/2)	Respuesta de Asesoría Legal sobre los pasos a seguir	2015-03-01	2015-07-31	100.00	30.00	Avance Parcial	Alto	La Junta Directiva de ASETEC, no ha realizado las consultas legales, debido a que no han sido registrados.	Entrega de documentación requerida por Dirección de Asesoría Legal UTP, para la conformación de la nueva Junta Directiva 2015-2017.	
Convocatoria a reunión de Invitación a los graduados para formar parte de la Junta de Elecciones de ASETEC (2/2)	Documentos del Registro Público de la nueva Directiva	2015-08-01	2015-08-31	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	No se ha firmado el documento legal (Acta) de la Nueva Junta Directiva (2013-2015) de ASETEC.	Se protocolizó mediante el Registro Público la escritura de la nueva junta directiva para su inscripción.	116.15.06.01.041: Correo electrónico del 29-07-2015, se solicita la firma del documento para la inscripción de la ASETEC en el Registro Público
Convocatoria, Calendario y Elecciones de la Junta Directiva (2/2)	Calendario de Elecciones	2015-09-01	2015-10-31	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	No se ha podido realizar esta actividad por firma de documento legal (Acta) de la Junta Directiva (2013-2015) y esta Junta Directiva de ASETEC, no se ha reunido con la Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión, debido a que no han sido registrados.	Se coordinará con ASETEC, fecha de convocatoria con el Sr. Rector.	116.15.06.01.041: Correo electrónico del 29-07-2015, se solicita la firma del documento para la inscripción de la ASETEC en el Registro Público
Toma de Posesión de la nueva Junta Directiva por la Junta de Elecciones (2/2)	Evidencias de los asistentes a la ceremonia de toma de posesión de la nueva directiva	2016-01-01	2016-01-31	100.00	0.00	Sin Avance	Muy Alto	No se ha podido realizar esta actividad por firma del documento legal (Acta) de la Junta Directiva (2013-2015).	Se protocolizó mediante el Registro Público la escritura de la nueva junta directiva para su inscripción.	116.15.06.01.041: Correo electrónico del 29-07-2015, se solicita la firma del documento para la inscripción de la ASETEC en el Registro Público

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN

Factor: Extensión Universitaria
Componente: Graduados
SubComponente: Vinculación de la Universidad con los graduados

Unidades de Apoyo: FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE AZUERO, CENTRO REG. DE BOCAS DEL TORO, CENTRO REG. DE COCLÉ, CENTRO REG. DE COLÓN, CENTRO REG. DE

Proyecto: 15 Reactivación de Asociación de Egresados de la UTP (ASETEC) y su vinculación con los egresados y graduados

Indicadores:

Objetivo: Reactivar las actividades de vinculación de la ASETEC con nuestra Institución, tales como participación en el fortalecimiento de planes y programas de estudios, evaluación y desarrollo de nuevas actividades que se conjuguen en

Agrupaciones formalmente constituidas de los graduados

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Notariado y vinculación de la nueva Junta Directiva con la UTP (2/2)	Documentos del Registro Público de la nueva Directiva	2016-02-01	2016-09-30	49.59	0.00	Sin Avance	Medio	No se ha podido realizar esta actividad por firma del documento legal (Acta) de la Junta Directiva (2013-2015).	Se protocolizó mediante el Registro Público la escritura de la nueva junta directiva para su inscripción.	116.15.06.01.041: Correo electrónico del 29-07-2015, se solicita la firma del documento para la inscripción de la ASETEC en el Registro Público
Vinculación de la ASETEC con la plataforma de Egresados ALUMNI-UTP	Vinculación entre la página web ASETEC, la Plataforma ALUMNI_UTP y ambas organizaciones con la UTP.	2013-10-01	2016-12-31	81.97	50.00	Avance Parcial	Medio	Falta de personal para programar las plataformas. El Sistema ALUMNI UTP, será reemplazado por el SISAE.	Se hizo un enlace entre la página Web UTP y la Plataforma Alumni. Se hará la solicitud a CIDITIC, para que realicen un link con la página Web de la Asociación de Egresados. Se está a la espera de que la aplicación (SISAE) se implemente y facilite a las Facultades la vinculación del graduado con las actividades de extensión.	111.14.05.03.078: Foto de reunión sostenida con VRA, CRA y Dirección de Extensión. 111.14.05.04.174: Nota VRA-N-449-2016. Invitación a Reunión de Seguimiento a Egresados, 111.14.05.03.180: PDF de la propuesta del SISAE. 116.15.06.01.041: Correo electrónico del 29-07-2015, se solicita la firma del documento para la inscripción de la ASETEC en el Registro Público.
Resultados Generales del Proyecto						Observaciones Generales del Proyecto				
Se protocolizó mediante el Registro Público la Escritura de la Junta Directiva 2013-2015 para su inscripción, sin embargo no se ha podido reactivar la Asociación de Egresados (ASETEC), debido a que no se han culminado trámites legales para lograr la inscripción de la junta Directiva.										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Factor: Gestión Institucional Universitaria
Componente: Filosofía institucional, políticas, normativa, proyecto
SubComponente: Misión, Visión, Valores

Unidades de Apoyo: RECTORÍA, DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, VICERRECTORIA ACADÉMICA,

Proyecto: 16 Elaboración e implementación del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017

Indicadores:

Objetivo: Definir el marco orientador y programa de trabajo para el período 2013-2017 que contemple los programas y proyectos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos por la UTP

Políticas que promueven y regulan el desarrollo de la gestión, Plan de Desarrollo Institucional

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Institucional (3/3)	Informes Anuales de Seguimiento PDI	2016-03-01	2016-03-31	100.00	85.00	Avance Parcial	Bajo	El informe anual 2015, cuenta con información preliminar debido al retraso en la entrega de información para la mayoría de los indicadores producto de la rotación del personal de enlace en las Unidades Coordinadoras. La falta de un aplicativo para el manejo de la información que permita agilizar el proceso de recolección de datos entre las unidades de enlace y la Coordinación del PDI, se convierte en una de las restricciones más preponderantes.	Revisión y Evaluación de Indicadores que no se han logrado medir en periodos anteriores	123.16.08.03.108: Informe de Seguimiento y Avances del Plan de Desarrollo Institucional para el año 2015
Resultados Generales del Proyecto						Observaciones Generales del Proyecto				
Para el año 2015, se presentó un informe preliminar. Se registró el 48% del total de indicadores que conforman el Plan de Desarrollo Institucional, en donde el 41.77% corresponde al Plan Académico y el 6.33% al Plan de Gestión. Dentro de este logro se registran indicadores que no se habían medido anteriormente, lo cual representa un avance para el registro de información valiosa que nos permita orientar la hoja de ruta para el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad Tecnológica de Panamá, teniendo presente que el PDI es un documento indicativo, flexible y dinámico que marca el horizonte a seguir en los próximos años.						- En la actualidad, de acuerdo a lo expuesto en cuanto a la rotación de personal, nos mantenemos en comunicación con la persona asignada en reemplazo del enlace que administraba la información de los indicadores de la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento (DGTC) y Centro de Emprendimiento, en busca de obtener la información para estos indicadores a la mayor brevedad posible. Esta información corresponde al 20% de los indicadores pendientes por medir. - Para el informe 2016 se estará registrando información de acuerdo a la periodicidad de la medición en cada indicador, en busca de aminorar el tiempo de generación de información para cada uno de ellos. Se estarán revisando los indicadores que conforman el PDI, con sus objetivos y avances con la finalidad de identificar si alguno de ellos requiere ser modificado o eliminado a través de la evaluación de sus logros durante el periodo. Esta acción se espera llevar a cabo con el apoyo de las diferentes unidades involucradas y el personal de la Dirección General de Planificación Universitaria.				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Componente: Recursos Humanos

SubComponente: Desarrollo del Recurso Humano

Proyecto: 17 Desarrollo e implementación de un Sistema Web de Registro y Seguimiento a la Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano de la UTP

Objetivo: Facilitar la gestión y toma de decisiones relacionadas con los procesos de Capacitación y Desarrollo, en cuanto a la formación y mejoramiento continuo del recurso humano que labora en la UTP.

Unidades de Apoyo:

RECTORÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Indicadores:

Seguimiento a la capacitación y desarrollo del recurso humano

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Validación del Sistema	Informe de validación del sistema	2014-08-01	2015-01-31	100.00	100.00	Conclusión Tardía			Se realizaron las pruebas finales del Aplicativo y se ejecutaron todos los reportes diseñados, adicional que se hicieron algunas adecuaciones para mejor presentación.	144.17.03.00.03: Comunicaciones: Solicitud de SHDITIC, Correos, Vista de Pantallas y modelo de reporte finalizado
Presentación y aprobación del Sistema por parte de las Autoridades Universitarias	Acta de la Reunión con las Autoridades Universitarias y documento aprobatorio del sistema	2015-02-01	2015-02-28	100.00	100.00	Conclusión Tardía		No se ha realizado la convocatoria para la presentación y lanzamiento del aplicativo "Historial Académico" ante las autoridades, debido a los procesos de re acreditación de carreras universitarias de nuestra Casa de Estudios Superiores, inicio de semestre y actualización del perfil académico del personal administrativo de la UTP.	Se realizó presentación ante las Autoridades de la DGRH del Aplicativo y se comunicó a través de nota formal a la máxima autoridad de la UTP (Rector) de la nueva aplicación desarrollada y de los beneficios que aportaría la misma, adicional que se le invitó a designar colaboradores de su unidad como usuarios potenciales de la misma.	144.17.04.00.188: PPT de Presentación de Aplicativo ante Autoridades de la DGRH, 144.17.04.00.178: Notificación al Rector sobre la convocatoria para la Presentación del Aplicativo Web a Usuarios Potenciales
Jornadas de capacitación en el uso del Sistema	Jornadas de capacitación desarrolladas (material presentado, listas de asistencias)	2015-03-01	2015-03-31	100.00	100.00	Conclusión Tardía		Debido a asignaciones especiales, alto volumen de trabajo, alta rotación del personal designado para el desarrollo del proyecto y presupuesto; adicional a la no concertación de fecha de lanzamiento y presentación del aplicativo ante las autoridades, no se han realizado las jornadas de capacitación a los usuarios finales, solo ante el personal que alimenta el sistema.	Se organizó el pasado 26 y 28 de abril de 2016 como consta en listas de asistencia jornada de Capacitación con Usuarios Potenciales de las principales unidades administrativas que solicitan información relativa al Perfil Académico y de Capacitación continua del Recurso Humano de la UTP; para fortalecer los procesos de acreditación universitaria, estudios especiales y rankings de nuestra Casa de Estudios Superiores.	144.17.05.00.151: Modelo de Nota de Invitación a Usuarios Potenciales y Equipo Técnico de DITIC, 144.17.05.00.189: PPT de Presentación de Aplicativo Web a Usuarios Potenciales. 144.17.05.00.140: Listas de Asistencia de Usuarios Potenciales de fecha 26 y 28/04/2016. 144.17.05.00.187: PPT de Fotos de Jornada de Capacitación 26 y 28/04/2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Factor: Gestión Institucional Universitaria
Componente: Recursos Humanos
SubComponente: Desarrollo del Recurso Humano

Unidades de Apoyo: RECTORÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Proyecto: 17 Desarrollo e implementación de un Sistema Web de Registro y Seguimiento a la Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano de la UTP

Indicadores:

Objetivo: Facilitar la gestión y toma de decisiones relacionadas con los procesos de Capacitación y Desarrollo, en cuanto a la formación y mejoramiento continuo del recurso humano que labora en la UTP.

Seguimiento a la capacitación y desarrollo del recurso humano

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Puesta en marcha del Sistema	Sistema en funcionamiento (reportes del sistema)	2015-04-01	2015-06-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		La aplicación "Historial Académico" se encuentra en funcionamiento, se están realizando las pruebas de corrida de la información y actualización de datos en cuanto a formación y educación continua se refiere; sin embargo la entrega oportuna de la información por parte de los colaboradores ha retrasado los procesos de actualización de la misma en la base de datos, adicional a la falta de recurso humano asignado a esta tarea considerando el volumen de información a procesar.	Se terminó de recopilar la información relativa a Perfeccionamiento Académico y Educación continua, más relevante, solicitada a través de la Circular DGRHC-050 de fecha 22/08/2014 y que se terminó de concretar en septiembre 2015, permitiendo generar los reportes respectivos como se adjunta en evidencia.	144.17.06.00.230: Vista de Pantalla del Aplicativo con el listado de todos los reportes en funcionamiento. 144.17.06.00.153: Modelo de reportes: Reporte de Certificación de Educación Continua, Reporte de Perfil Académico Completo
Actualización y Mantenimiento del Sistema (1/4)	Sistema actualizado y en funcionamiento (detalle de adecuaciones, reportes del sistema)	2015-04-01	2015-12-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria		El alto volumen de trabajo y la falta de personal técnico trabajando en la adecuación de los reportes trajo un retraso en el cumplimiento de lo programado.	A finales del mes de enero y febrero de 2016 se pudo corregir este atraso, a través de la adecuación y corrido de los reportes finales diseñados ajustando las respectivas salidas web del aplicativo.	144.17.07.01.152: Modelo de Reportes Ajustados Finales del Aplicativo Web: Reporte de Capacitación de Colaboradores (Sin capacitación)
Actualización y Mantenimiento del Sistema (2/4)	Sistema actualizado y en funcionamiento (detalle de adecuaciones, reportes del sistema)	2016-03-01	2016-03-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria			Se hicieron las corridas de los respectivos reportes después de sus adecuaciones finales y el sistema se encuentra en funcionamiento.	144.17.07.01.152: Modelo de Reportes Ajustados Finales del Aplicativo Web: Reporte de Capacitación de Colaboradores (Sin capacitación)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Resultados Generales del Proyecto

Se capacitó a los usuarios potenciales de la Aplicación y tanto el administrador de la aplicación (Departamento de Capacitación y Desarrollo de la UTP), como unidades Administrativas de Alta Jerarquía (Rectoría) se están viendo beneficiados por dicha aplicación.

Observaciones Generales del Proyecto

Debido al alto volumen de información que se debía procesar, adicional a la falta de recursos humanos y equipo Técnico disponible se produjo un retraso en el cumplimiento de algunas de las etapas del proyecto, situación que finalmente fue corregida logrando poner el Aplicativo Web de Registro y Seguimiento a la Capacitación y Desarrollo del Recurso Humano de la UTP en funcionamiento y al servicio de los Usuarios Potenciales Finales en su primera versión .

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Factor: Gestión Institucional Universitaria
Componente: Infraestructura
SubComponente: Políticas

Unidades de Apoyo:
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA,
 VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, VICERRECTORÍA ACADÉMICA, VICERRECTORÍA DE INV. POSTGRADO Y EXT.

Proyecto: 18 Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura

Indicadores:

Objetivo: Orientar las políticas de acción para la promoción, desarrollo y reordenación de la infraestructura de los servicios que brinda la Universidad Tecnológica de Panamá; con el fin de priorizar los recursos para la inversión y la operación

Políticas institucionales que regulan la utilización de la planta física y su relación con las necesidades de la institución

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (10/16)	Informes de seguimiento a Proyectos de Inversión	2015-06-01	2015-06-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				152.18.05.10.112: Informe: "Proyectos Internos en Ejecución, Coordinado por la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura", Período comprendido desde el 1 de junio de 2015 al 30 de abril de 2016.
Ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (11/16)	Informes de seguimiento a Proyectos de Inversión	2015-09-01	2015-09-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				152.18.05.10.112: Informe: "Proyectos Internos en Ejecución, Coordinado por la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura", Período comprendido desde el 1 de junio de 2015 al 30 de abril de 2016.
Ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (12/16)	Informes de seguimiento a Proyectos de Inversión	2015-12-01	2015-12-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				152.18.05.10.112: Informe: "Proyectos Internos en Ejecución, Coordinado por la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura", Período comprendido desde el 1 de junio de 2015 al 30 de abril de 2016.
Ejecución y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura (13/16)	Informes de seguimiento a Proyectos de Inversión	2016-03-01	2016-03-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				152.18.05.10.112: Informe: "Proyectos Internos en Ejecución, Coordinado por la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura", Período comprendido desde el 1 de junio de 2015 al 30 de abril de 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad

Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Resultados Generales del Proyecto

La Dirección General de Ingeniería y Arquitectura, contribuye a la ejecución de diversos proyectos para la UTP a nivel nacional como lo son: Construcción del edificio para la Dirección de Tecnología de la Información - DITIC, edificio para los Centros de Investigación, se trabaja en el suministro e instalación de ascensores panorámicos, para los edificios N°1 y N°3, se acondicionan aires acondicionados para todas las instalaciones en el Campus Víctor Levi Sasso, se construyen y acondicionan facilidades para toda la comunidad universitaria como son las canchas deportivas, ampliación de aceras, puente peatonal, acondicionamiento de todos los sistemas sanitarios; Se licitó el edificio de aulas en el Centro Regional de Panamá Oeste, se acondiciona el Taller de Eléctrica, Chiriquí.

Observaciones Generales del Proyecto

Se envían informes, documentación y fotos que sustentan el avance de los diversos proyectos para el período comprendido desde el 1 de junio de 2015 al 30 de abril de 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Componente: Infraestructura

SubComponente: Laboratorios

Proyecto: 19 Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la UTP

Objetivo: Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje complementándolos con prácticas de laboratorios actualizadas y orientadas a capacitar a nuestros estudiantes en las tecnologías de punta que encontrarán en su medio de trabajo

Unidades de Apoyo:

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y COMPRAS, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y

Indicadores:

Porcentaje de satisfacción con la disponibilidad de equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Actualización del documento de Proyecto de acuerdo a las necesidades, para el Anteproyecto de Presupuesto de Inversión de la Institución [5/5]	Documento de Proyecto actualizado	2016-01-01	2016-02-28	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				162.19.01.05.182: Perfil de Proyecto: Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá 2015, 162.19.01.05.181: Perfil de Proyecto: Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá 2014
Incorporación del Proyecto en el Anteproyecto de Presupuesto de la Institución para la siguiente vigencia fiscal [5/5]	Fichas de proyecto del Sistema Nacional de Inversiones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas	2016-02-01	2016-04-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				162.19.02.05.073: Ficha de Proyecto: Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá 2016, 162.19.02.05.072: Ficha de Proyecto: Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá 2015
Establecimiento de prioridades para asignación de fondos de la vigencia para la ejecución del año en curso (5/5)	Informes de reuniones de seguimiento a los proyectos	2016-01-01	2016-04-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				162.19.03.05.113: Informe: Decisiones de Proyectos de Inversión 2015
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de los equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios (4/5)	Requisiciones de Compras	2015-04-01	2015-11-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				162.19.03.05.114: Informe: Desarrollo de Actividades Comprendidas en los Proyectos del Plan de Mejoramiento Institucional Año 2015 (Requisiciones reposan en las oficinas de la DNPC)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Componente: Infraestructura

SubComponente: Laboratorios

Proyecto: 19 Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la UTP

Objetivo: Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje complementándolos con prácticas de laboratorios actualizadas y orientadas a capacitar a nuestros estudiantes en las tecnologías de punta que encontrarán en su medio de trabajo

Unidades de Apoyo:

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA Y COMPRAS, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, VICERRECTORIA ACADÉMICA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y

Indicadores:

Porcentaje de satisfacción con la disponibilidad de equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de los equipos, recursos y materiales para la utilización adecuada de los laboratorios (5/5)	Requisiciones de Compras	2016-04-01	2016-11-30	24.69	24.69	Avance Satisfactorio				162.19.04.05.105: Informe de Inversión Año 2016 (Requisiciones y Actos Públicos) (Requisiciones reposan en las oficinas de la DNPC)
Ejecución y seguimiento del Proyecto (4/5)	Informes de seguimiento a los proyectos y de ejecución presupuestaria de inversiones	2015-04-01	2015-11-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				079.11.04.04.102: Informe de Ejecución Presupuestaria Diciembre 2015
Ejecución y seguimiento del Proyecto (5/5)	Informes de seguimiento a los proyectos y de ejecución presupuestaria de inversiones	2016-04-01	2016-11-30	24.69	24.69	Avance Satisfactorio				079.11.04.04.103: Informe de Ejecución Presupuestaria Mayo 2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Resultados Generales del Proyecto

La Institución cada año asigna los fondos para el equipamiento y actualización de los laboratorios de facultades y centros regionales. Las mejoras pretenden mantener el alto nivel de aprendizaje de los estudiantes, mediante el uso de equipos actuales, utilizados en el mercado laboral, además de fortalecer lo requerido para los procesos de acreditación nacional e internacional.

Observaciones Generales del Proyecto

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Componente: Infraestructura

SubComponente: Laboratorios

Proyecto: 20 Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Laboratorios y Talleres a nivel nacional

Objetivo: Mantener un constante proceso de mantenimiento a los talleres y laboratorios de la Universidad a nivel nacional

Unidades de Apoyo:

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., DIRECCION DE MANTENIMIENTO, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS

Indicadores:

Mantenimiento de laboratorios y talleres con la debida renovación y adecuación

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Incorporación de necesidades de reparación y mantenimiento en el Presupuesto Institucional de la vigencia del año siguiente [5/5]	Proyectos o sub-proyectos de inversión formulados para la vigencia correspondiente. Anteproyecto de Presupuesto solicitado por las facultades y Centros Regionales	2016-01-01	2016-03-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				162.19.01.05.181: Perfil de Proyecto: Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá 164.20.02.05.008: Anteproyecto de Presupuesto 2016 (Funcionamiento y Gestión Institucional) 164.20.02.05.070: Ficha de Proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas del Proyecto Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá
Priorización de intervenciones y costos asociados (5/5)	Detalle de asignación de recursos, por parte de las autoridades. Reportes pormenorizados del presupuesto recomendado por el MEF para las vigencias correspondientes	2016-01-01	2016-03-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				164.20.03.05.199: Reporte pormenorizado del presupuesto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2016 (Cuenta 180 - Presupuesto de Funcionamiento)
Asignación de tareas para la ejecución de la obra (5/5)	Nota informativa a las unidades sobre la asignación de recursos para la ejecución de proyectos a través del Presupuesto de Inversiones de la vigencia correspondiente. Requisiciones y/o órdenes de compra generadas para	2016-04-01	2016-04-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				164.20.04.05.177: Notas Informativas a las Unidades sobre la asignación de recursos para la ejecución de Proyectos a través del Presupuesto de Inversiones del año 2016.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Componente: Infraestructura

SubComponente: Laboratorios

Proyecto: 20 Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Laboratorios y Talleres a nivel nacional

Objetivo: Mantener un constante proceso de mantenimiento a los talleres y laboratorios de la Universidad a nivel nacional

Unidades de Apoyo:

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORM. Y COMUNIC., DIRECCION DE MANTENIMIENTO, VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS

Indicadores:

Mantenimiento de laboratorios y talleres con la debida renovación y adecuación

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Ejecución y seguimiento de las distintas obras del proyecto (4/5)	Detalle de los pagos de los proyectos de inversión generados por la Dirección de Finanzas. Informes mensuales de seguimiento al avance físico y al avance financiero de los proyectos. Detalle de lo comprometido en	2015-05-01	2015-12-31	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				164.20.05.04.055: Cuadro de Ejecución Presupuestaria de Funcionamiento a nivel de objeto de gasto al 30 de diciembre 2015
Ejecución y seguimiento de las distintas obras del proyecto (5/5)	Detalle de los pagos de los proyectos de inversión generados por la Dirección de Finanzas. Informes mensuales de seguimiento al avance físico y al avance financiero de los proyectos. Detalle de lo comprometido en	2016-05-01	2016-12-31	12.30	12.30	Avance Satisfactorio				164.20.05.05.056:: Cuadro de Ejecución Presupuestaria de Funcionamiento al 30 de Abril de 2016
Resultados Generales del Proyecto						Observaciones Generales del Proyecto				
Para este periodo se ha continuado con la ejecución de los trabajos de mantenimiento de los laboratorios de las Facultades y de los Centros Regionales con el objetivo de seguir brindando un servicio de Calidad a la comunidad estudiantil. En el año 2016, por medio del Presupuesto Ley de Inversiones se asignó B/.285,580.00 para el Proyecto Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales. Al mes de abril de 2016 tuvo una ejecución de B/.109,294.83.										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Gestión Institucional Universitaria
Componente: Infraestructura
SubComponente: Bibliotecas

Unidades de Apoyo:
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, VICERRECTORIA ACADÉMICA, DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE

Proyecto: 21 Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Indicadores:

Objetivo: Fortalecer la disponibilidad de Bases de Datos Bibliográficas y colecciones para uso de docentes e investigadores

Base de datos y redes especializadas relacionadas con los programas que ofrece la institución

Actividad	Indicador de Seguimienrto	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Actualización del documento de Proyecto de acuerdo a las necesidades, para el Anteproyecto de Presupuesto de Inversión de la Institución [5/5]	Documento de proyecto actualizado	2016-01-01	2016-02-29	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				168.21.01.05.165: Nota DIPLAN-DPPD-N-105-16 Respuesta a solicitud de información 168.21.01.05.183: Perfil del Proyecto: Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá 2014
Incorporación del proyecto en el Anteproyecto de Presupuesto de la Institución para la siguiente vigencia fiscal [5/5]	Ficha del Proyecto del Sistema Nacional de Inversiones Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas	2016-01-01	2016-04-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				168.21.02.05.071: Ficha de Proyecto: Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá 2015 168.21.01.05.165: Nota DIPLAN-DPPD-N-105-16 Respuesta a solicitud de información
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de las Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales [4/5]	* Requisiciones de Compras * Informes de Reuniones de Seguimiento a los Proyectos	2015-04-01	2015-11-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				168.21.03.04.206: REQUISICIÓN SBSE12015-2668, 168.21.03.04.201: REQUISICIÓN SBSE12015-1969, 168.21.03.04.202: REQUISICIÓN SBSE12015-1970, 168.21.03.04.204: REQUISICIÓN SBSE12015-1972, REQUISICIÓN 168.21.03.04.205: SBSE12015-1975, 168.21.03.04.203: REQUISICIÓN SBSE12015-1971

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
 AI 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Factor: Gestión Institucional Universitaria

Componente: Infraestructura

SubComponente: Bibliotecas

Proyecto: 21 Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación en la Universidad Tecnológica de Panamá

Objetivo: Fortalecer la disponibilidad de Bases de Datos Bibliográficas y colecciones para uso de docentes e investigadores

Unidades de Apoyo:

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA, VICERRECTORIA ACADÉMICA, DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS, FACULTAD DE ING. CIVIL, FACULTAD DE ING. ELÉCTRICA, FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL, FACULTAD DE ING. MECÁNICA, FACULTAD DE ING. DE SISTEMAS COMPUT., FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CENTRO REG. DE

Indicadores:

Base de datos y redes especializadas relacionadas con los programas que ofrece la institución

Actividad	Indicador de Seguimiento	Fecha Inicial	Fecha Final	Avance Programado	Avance Ejecutado	Estado de la Actividad	Nivel de Riesgo	Restricciones	Acciones Correctivas	Listado de Evidencias Particulares
Gestión de los procesos requeridos para la adquisición de las Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales [5/5]	* Requisiciones de Compras * Informes de Reuniones de Seguimiento a los Proyectos	2016-04-01	2016-11-30	24.69	24.69	Avance Satisfactorio				168.21.03.05.211: REQUISICIÓN SBSE12016-984. 168.21.03.05.207: REQUISICIÓN SBSE12016-890. 168.21.03.05.208: REQUISICIÓN SBSE12016-975. 168.21.03.05.209: REQUISICIÓN SBSE12016-979. 168.21.03.05.210: REQUISICIÓN SBSE12016-983
Ejecución y seguimiento al Proyecto [4/5]	Informes de seguimiento	2015-04-01	2015-11-30	100.00	100.00	Conclusión Satisfactoria				079.11.04.04.102: Informe de Ejecución Presupuestaria. Diciembre 2015
Ejecución y seguimiento al Proyecto [5/5]	Informes de seguimiento	2016-04-01	2016-11-30	24.69	24.69	Avance Satisfactorio				162.19.05.05.103: Informe de Ejecución Presupuestaria Mayo 2016

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Registro de Avance Ejecutado por Actividad
Al 31 de mayo 2016

Unidad Coordinadora: VICERRECTORIA ACADÉMICA

Resultados Generales del Proyecto

La disponibilidad de bases de datos bibliográficas y colecciones digitales existentes, a través de la biblioteca, fortalecen los procesos que realizan los sectores académicos y de investigación.

Observaciones Generales del Proyecto

El acceso a las bases de datos contribuye al posicionamiento del ranking de la Universidad Tecnológica de Panamá.

ANEXO 4.

EVIDENCIAS
(Digitalizadas)
